

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 08/12/2021

Inspecteur: Sabri Cingoz

Mentor: -

Installateur: -

ID-label: -

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481236

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Termaden
Huisnummer 3
Busnummer
Postcode 3980
Gemeente TESSENDERLO
Land België

Eigenaar

Naam Dirk Dirkx
Straatnaam Termaden
Huisnummer 3
Busnummer
Postcode 3980
Gemeente TESSENDERLO
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 541

Teller Nr.: : 47193410

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop op vraag van de verkoper volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 8.4.2. en 8.2.1. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²


Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 9

Ri algemeen: 0,788 MΩ

OK

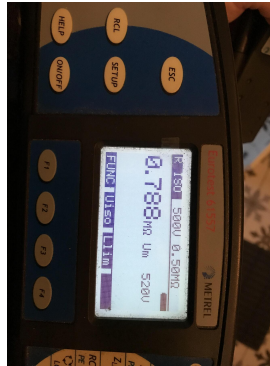

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 27,0 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	6		2	1,5
5	C	16		2	1,5
2	C	20		2	2,5
1	C	25		4	6

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen niet van toepassing

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen OK

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 28 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.

nota/note 31 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de 15 uitzonderingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/12/2046

☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 12

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Sabri Cingoz



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/12/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

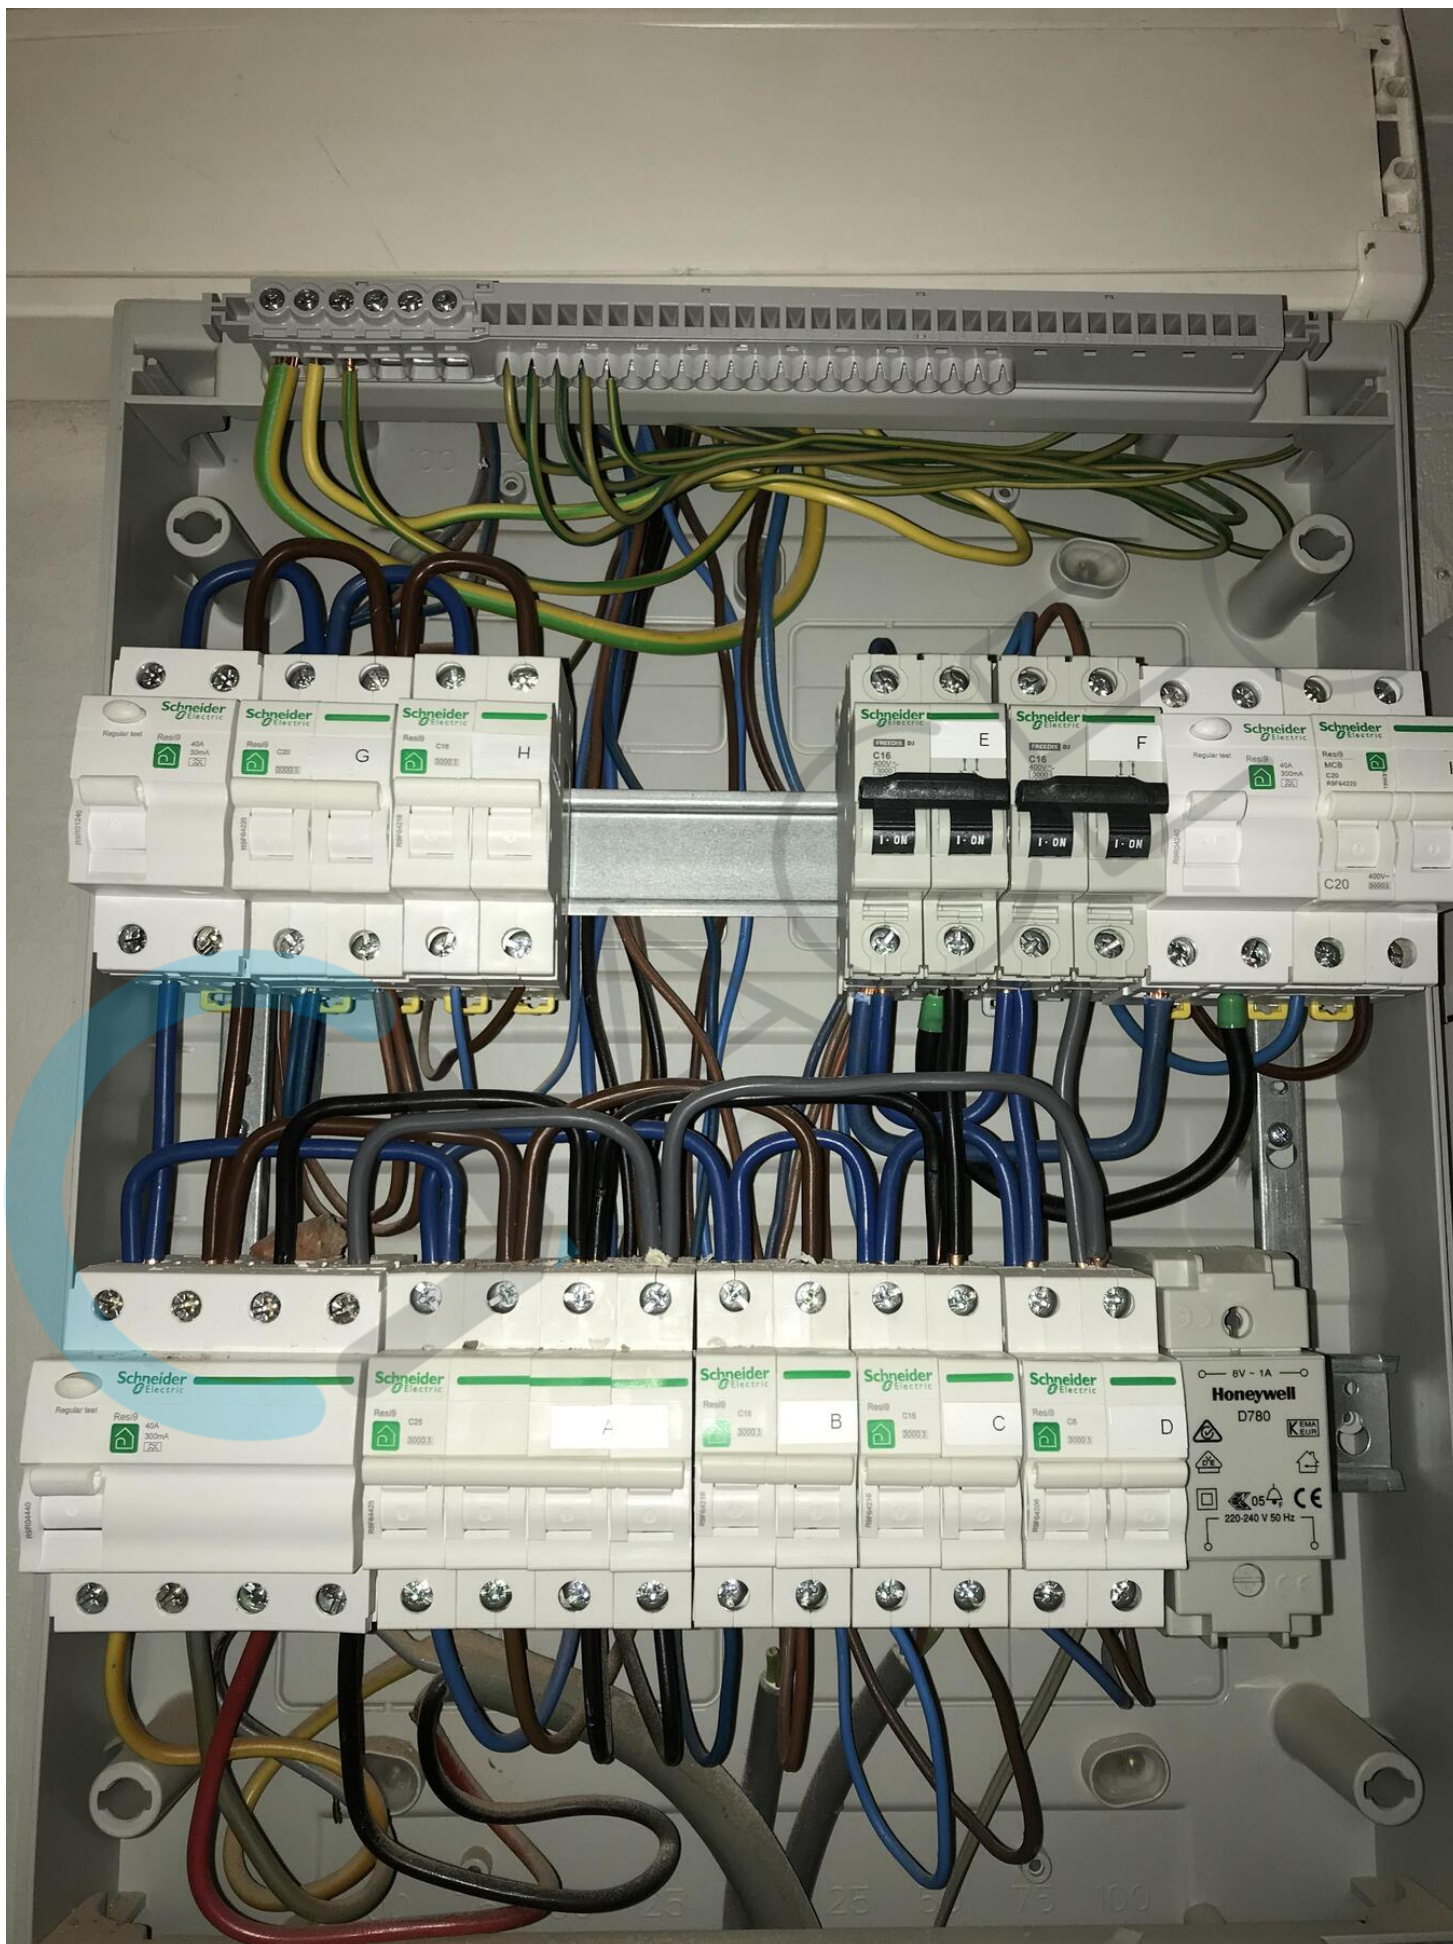



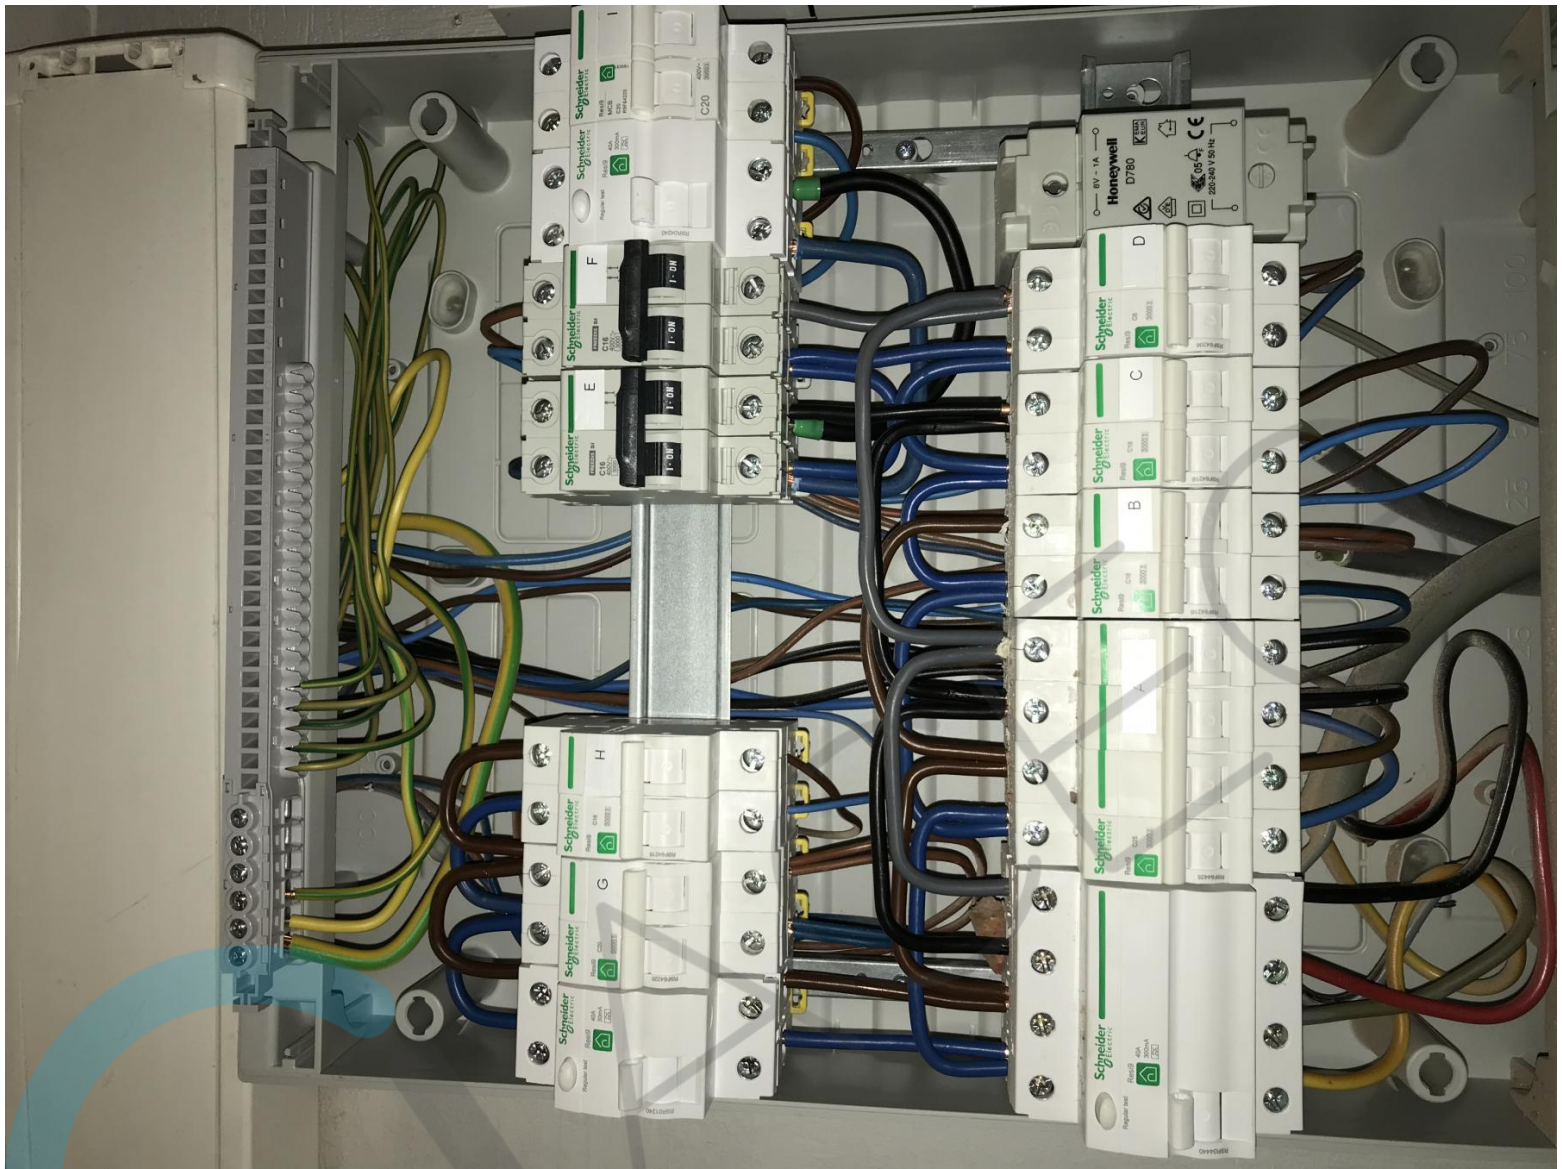











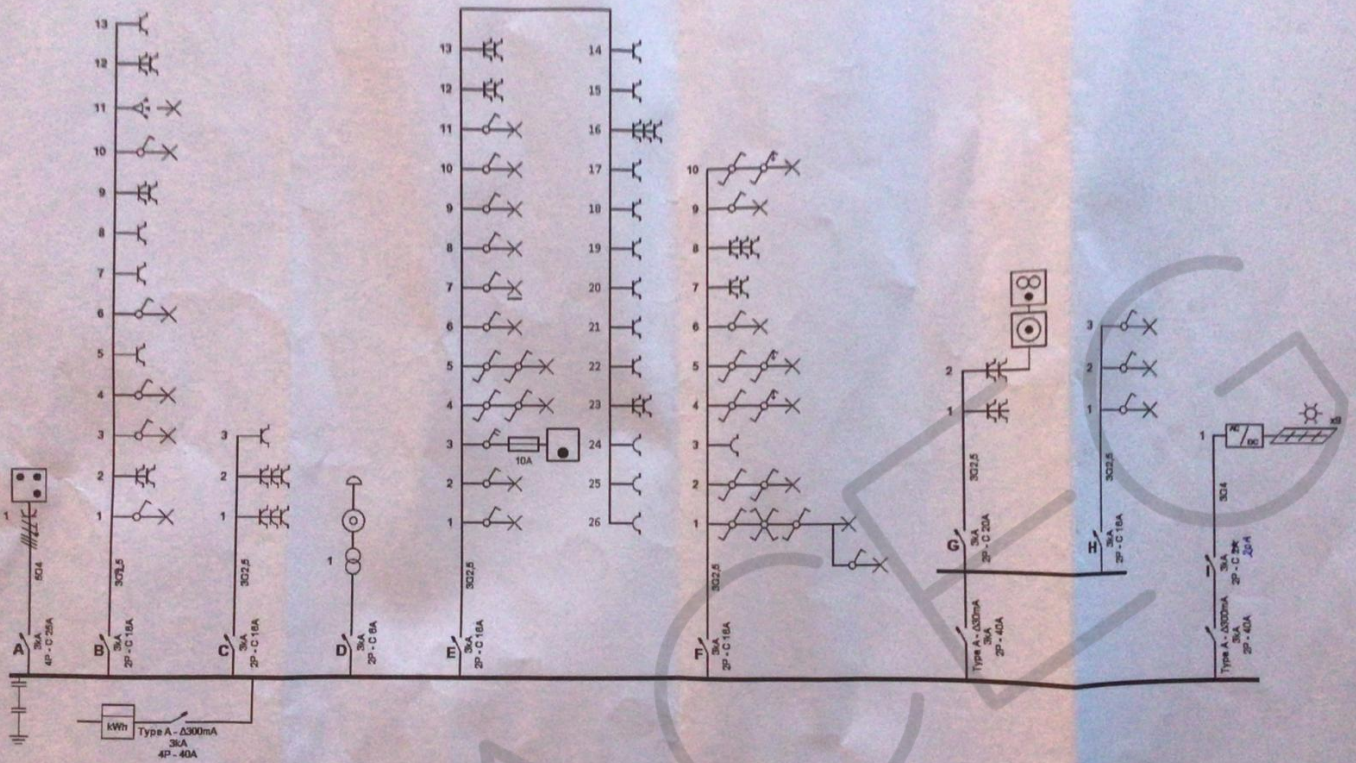

Eigenaar / Plaats installatie	Installateur:	Erkend Organisme:	Eendraadschema
Dirk Dirckx	Niet gekend		Blad 1/1
Termaden 3	Renovatie werken:		
3980 Tessenderlo	Jannes De Caluwe RR: 970616-201-40 <i>Jannes</i>	QACEG 1326 Sabri Cingoz	30/11/2021
	Kerkstraat 46	<i>08-12-2021</i>	p. 1/3
	3290 Schaffen		


ZOLDER

- I Zolder 1
- II Zolder 2

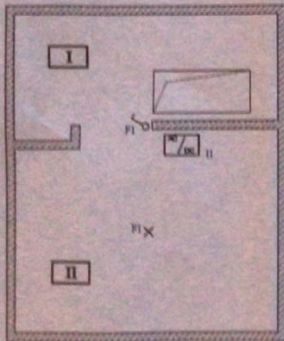


BOVENVERDIEPING

- I Slaapkamer 1
- II Slaapkamer 2
- III Badkamer
- IV Hal boven
- V Slaapkamer 3
- VI Slaapkamer 4

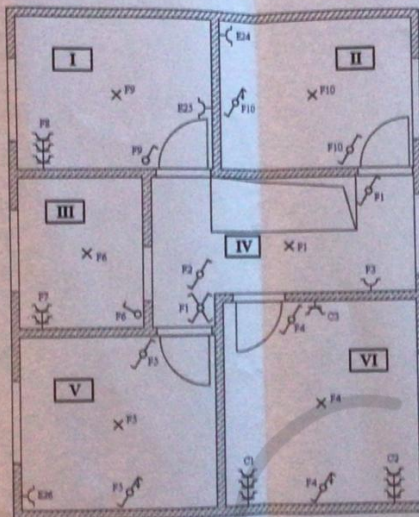


KELDER

- I Kelder 1
- II Kelder 2 - CV



Eigenaar / Plaats installatie	Installateur:	Erkend Organisme:	Situatieschets Zolder, Verdiep en Kelder
Dirk Dirckx	Niet gekend		Blad 1/1
Termaden 3	Renovatie werken:		30/11/2021
3980 Tessenderlo	Jannes De Caluwe RR: 970616-201-40	MACS 126 Sabri Cingox	p. 3/3
	Kerkstraat 46		
	3290 Schaffen		

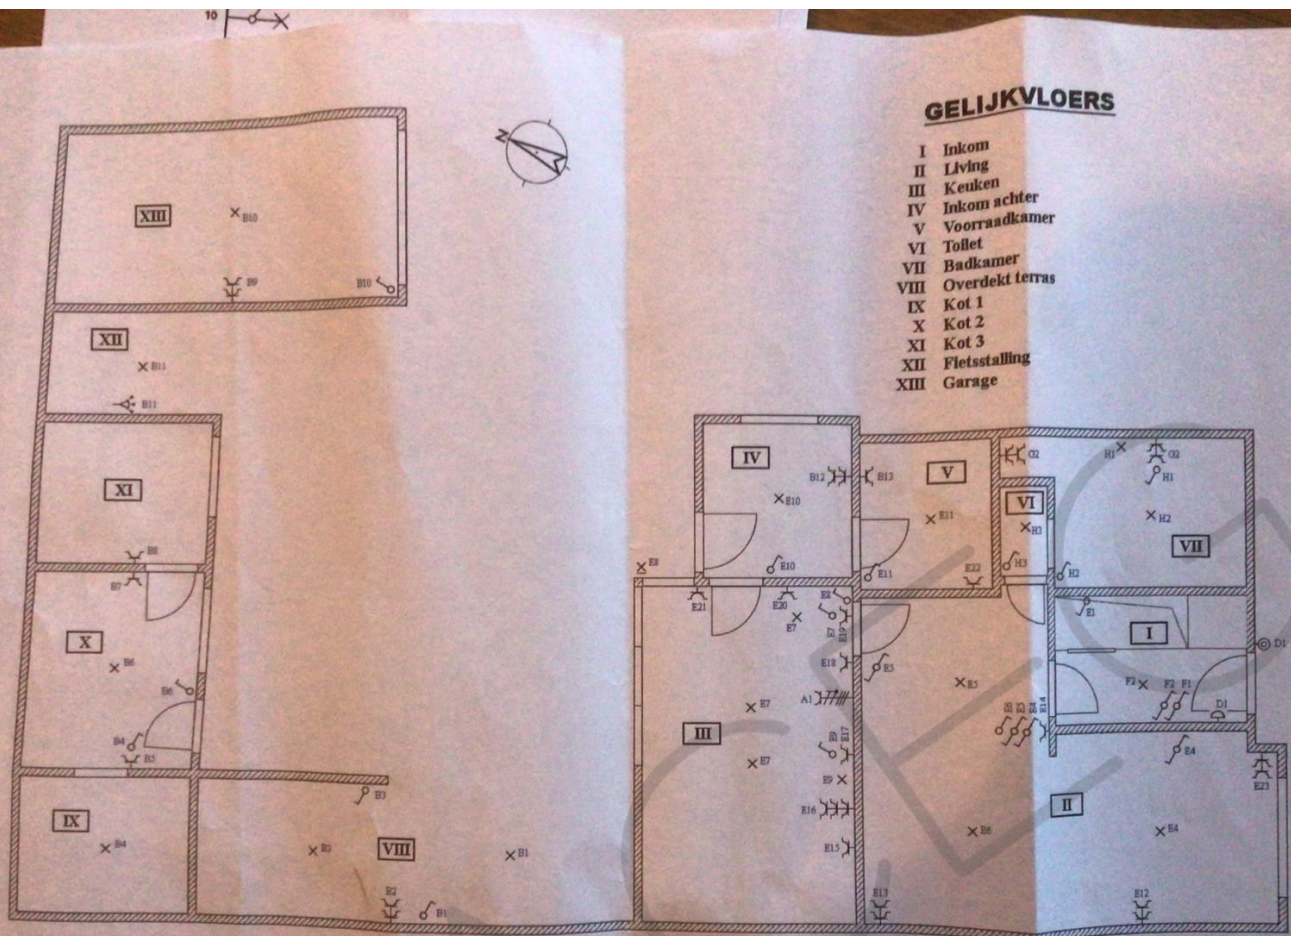**Eigenaar / Plaats installatie**

Dirk Dirckx

Termaden 3

3980 Tessenderlo

Installateur:

Niet gekend

Renovatie werken:

Jannes De Caluwe RR: 970616-201-40

Kerkstraat 46

3290 Schaffen

Erkend Organisme:

QACEG 1261
 Katri Cingoz

08-12-2021

Situatieschets Gelijkvloers

Blad 1/1

30/11/2021

p. 2/3





