

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### NIET CONFORM

Datum keuring: 19/02/2020 Inspecteur: Tom Anthonis Mentor: - Installateur: -  
ID-label: Combi EPC + EK Client reference: -  
B.T.W. nr.: - IK. nr.: -

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serie Nr.: 18460126

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Van Nevelestraat  
Huisnummer 16  
Busnummer 1  
Postcode 2100  
Gemeente Deurne  
Land België

Naam contactpersoon Patricia Van Gaever  
Telefoon 479362841  
Gsm nr. (SMS)

#### Eigenaar

Naam -  
Straatnaam Van Nevelestraat  
Huisnummer 16  
Busnummer 1  
Postcode 2100  
Gemeente Deurne  
Land België

#### Installateur

Naam -  
BTW nr. -  
Telefoonnummer -  
E-mail -

Type : appartement EAN : 54144 Teller Nr.: : 37811445

**Aard onderzoek:** Overdracht van eigendom van een huishoudelijke installatie van voor 1981 op vraag van de verkoper volgens AREI artikels 276bis, 278 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup> Max beveiliging: 32 A  
Aantal borden: 2 Aantal kringen: 15+ Isolatie: 54.9 MΩ

Aardelektrode: RE: Niet gemeten Ω

#### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I-t | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|-----|------|--------------------|------|-------|
|---------|--------|-----------------|-----|------|--------------------|------|-------|

#### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Test | Sectie (mm²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|------|--------------|
| 2              | C     | 16                 |          | 2 | -    |              |
| 1              | C     | 20                 |          | 2 | -    |              |
| 4              | U     | 10                 |          | 1 | -    |              |
| 1              | U     | 10                 |          | 2 | -    |              |
| 2              | U     | 16                 |          | 1 | -    |              |
| 2              | U     | 20                 |          | 1 | -    |              |

Visueel nazicht (algemeen) ☐ OK ☒ NOK Directe aanraking ☐ OK ☒ NOK Indirecte aanraking ☐ OK ☒ NOK  
Aansluitingen ☐ OK ☒ NOK Correcte schema's ☐ OK ☒ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☒  
Equipotentiale verbindingen ☐ OK ☒ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting  
Continuïteit ☐ OK ☒ NOK Verlichting / toestellen ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT



#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

##### Opmerking

I1.01 Eëndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art16, 268, 269)

I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art269)

I3.05 Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk/niet bereikbaar. (art15.01, 70.05) De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm (huishoudelijke installatie)

I4.01 Hoofdequipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden, ontbreken, zijn niet geel-groen, onvolledig, <6mm<sup>2</sup>. (art72, 86.05, 78.05)

I5.09 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (art19, 49.01)

I6.01 Een verzegelbare algemene differentieelschakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie. (art86.07)

**Opmerking**

I7.02 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van kalibreerelementen. (art251.01)

I8.07 Leidingen zijn te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen. (art143, 209)

I8.08 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen, kabelgoten geïnstalleerd worden. (art207, 210)

I8.13 Kabels van het type VTLmb, LMVVR, COAX, VVT en kabels van het type H05VVF en H07RN-F zijn verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB. (art198) Kelder.

I9.03 De verbindingen dienen verwezenlijkt te worden in borden, verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen of verlichtingsarmaturen. (art207.07)

I9.14 Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten. (art104) Kelder / keuken

O18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI.

O3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

**BESLUIT**

- ☐ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☐ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum: 19/9/2021

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Tom Anthonis

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

**Stappenplan voor een installatie die niet conform is:**

| Stap 1                                                                                                                                                                                                                                                    | Stap 2                                                                                                                                                                                                                                                          | Stap 3                                                                                                                    | Stap 4                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dit verslag is een verslag dat aangeeft wat de status is van de elektrische installatie. Op deze manier wordt de koper bij de verkoop van de woning ingelicht over de status van de installatie en kan hij een inschatting maken van de mogelijke kosten. | De koper heeft 18 maanden tijd na aktedatum om de vermelde inbreuken op te lossen. Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak, zo kunnen wij uw dossier opvolgen en vervolledigen. | De herkeuring moet uitgevoerd worden voor 18 maanden na aktedatum, bij ACEG wordt volgende datum geregistreerd: 19/9/2021 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is. |

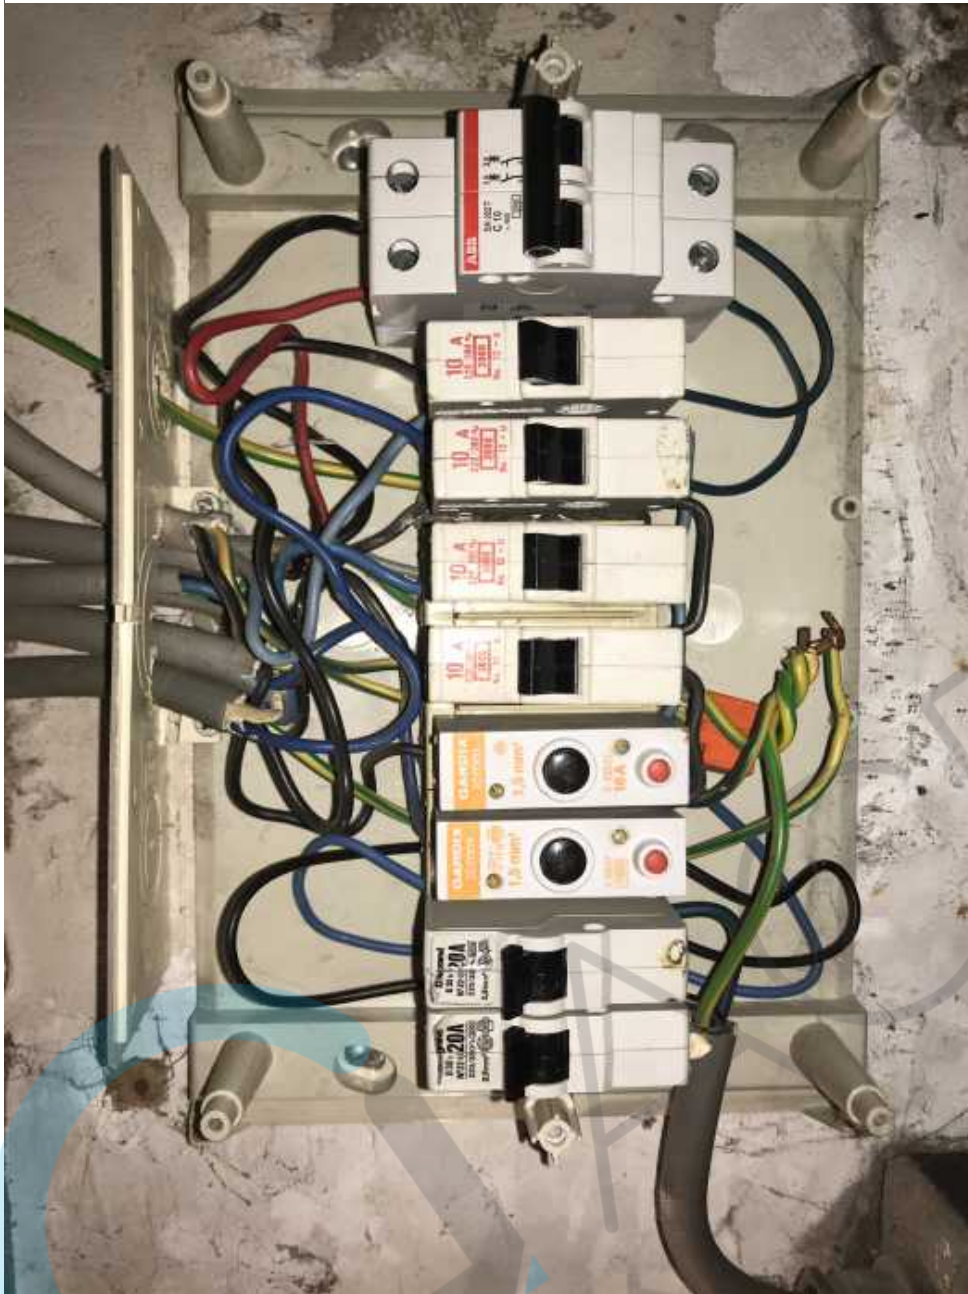

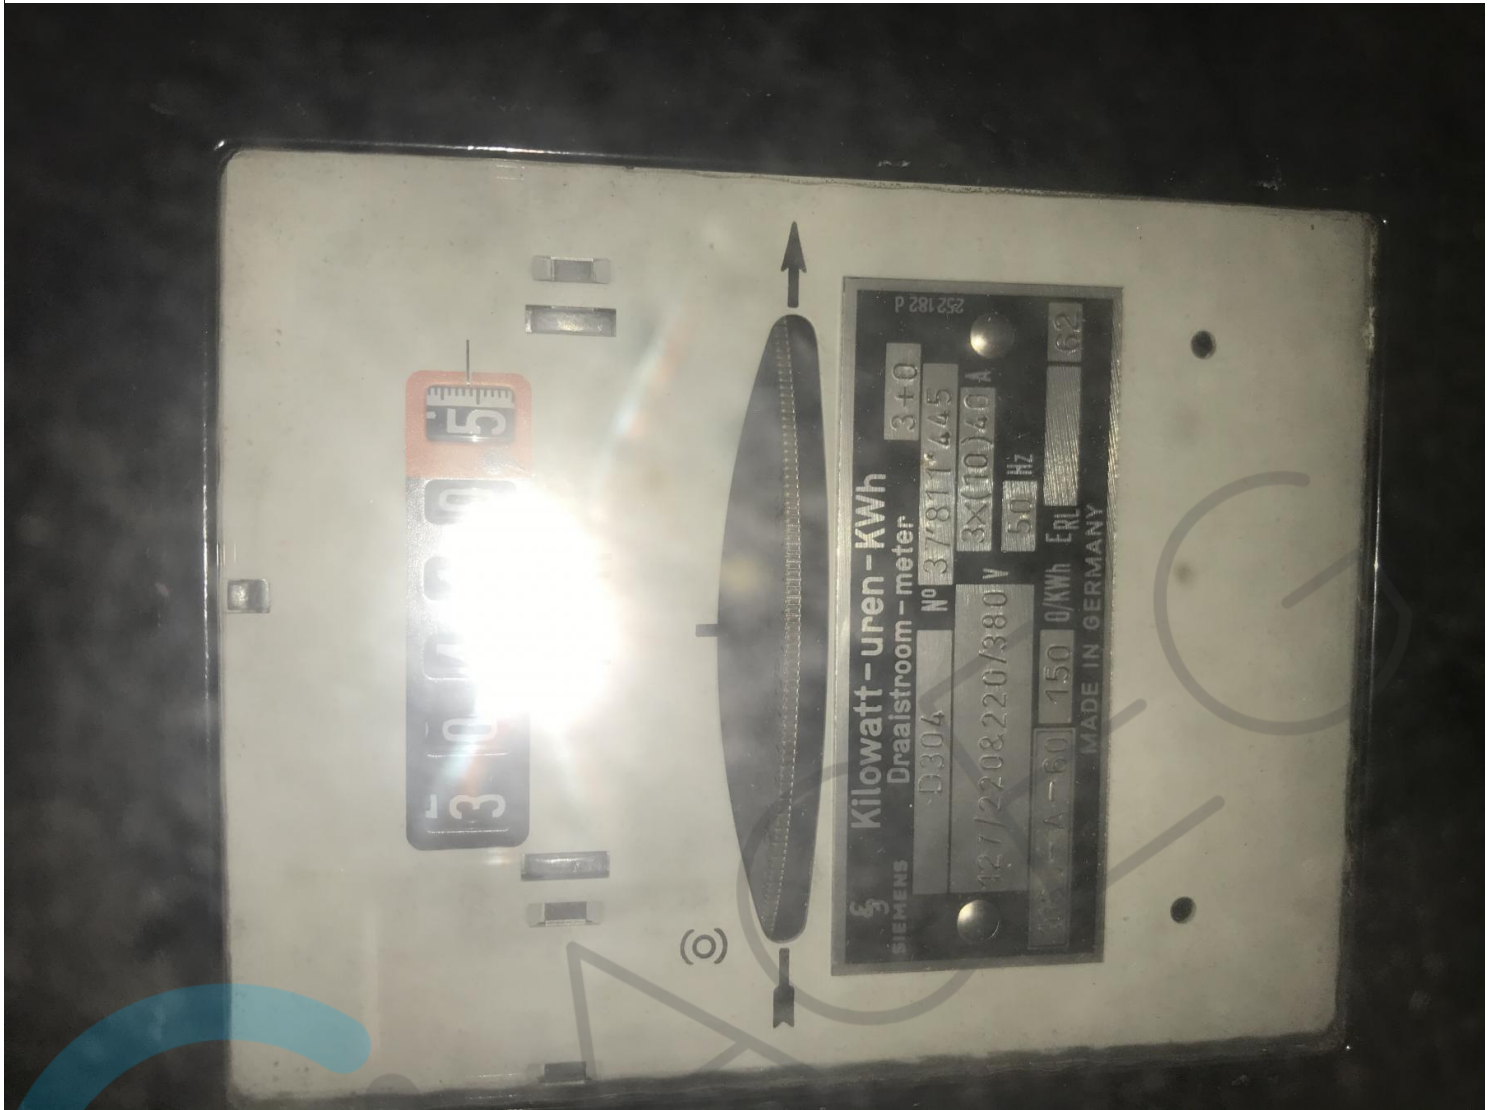













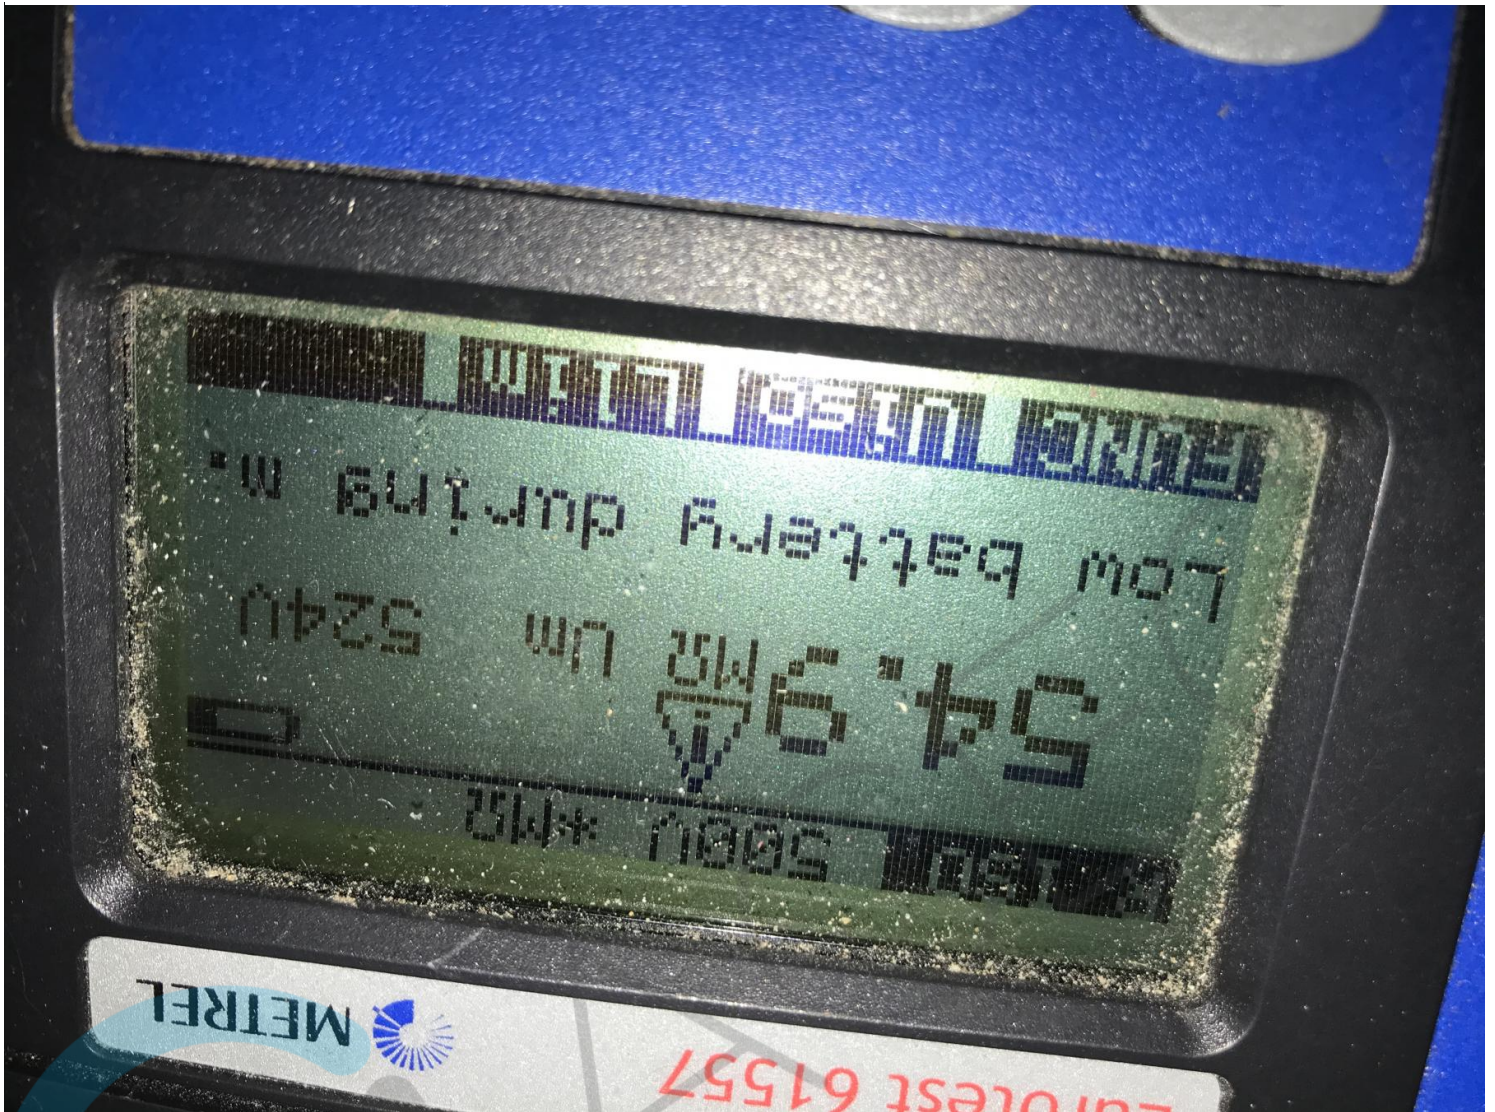






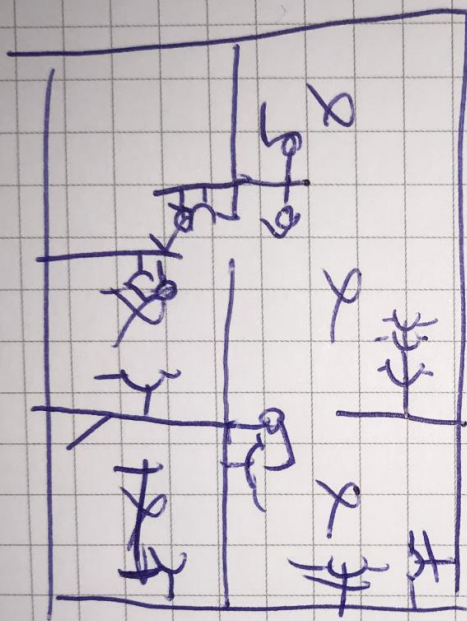

GLV

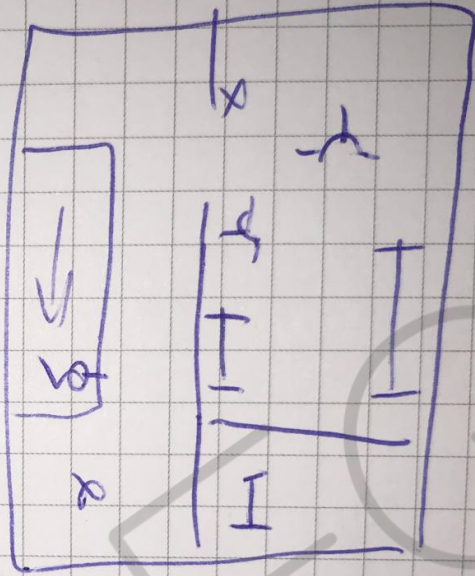

Kelder
