

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0552-181220-03 Datum van het onderzoek : 20/12/18
Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : ALBE

THEO VAN DEN BOSCHSTRAAT 69
bus 002
2100 DEURNE

EIGENAAR :

ALBE

Adres :

THEO VAN DEN BOSCHSTRAAT 69
bus 002
2100 DEURNE

OPDRACHTGEVER :

DEKKERS ELEKTRICITEITSWERKEN

Adres :

BEULKEN 6
2321 MEER


INSTALLATEUR :

DEKKERS ELEKTRICITEITSWERKEN

Adres :

BEULKEN 6
2321 MEER

Visualisatie van de installatie

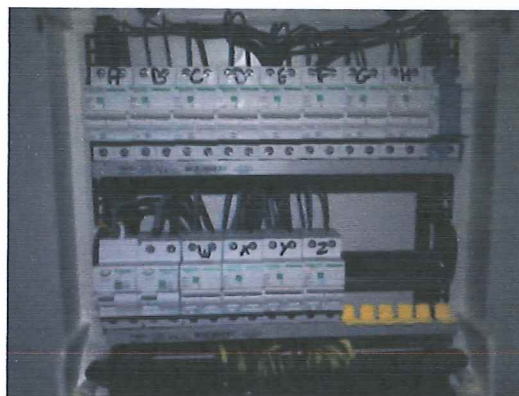

BTW of IK : 0832234363

EAN :

Teller nr.

te plaatsen

Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie /	Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	2 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	13
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

VMA - 44

MA-LS-02/2015



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 3,3 Ohm RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

FASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20.12.2043 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0552 JELLE HERMANS

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de slaat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

VMA - 44

Verslagnummer 0552-181220-03



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 20.12.2043.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Licht leefruimte,
Terras

Licht berging, toilet,
Wasplaats, slaapkamer

CV, ventilatie
Sk telenet

Sk werkblad

Sk werkblad
Ijskast, dampkap

Sk oven

Sk leefruimte,
Terras

Sk slaapkamer


Fornuils

Badkamer

Wasmachine

Droogkast

Vaatwasser

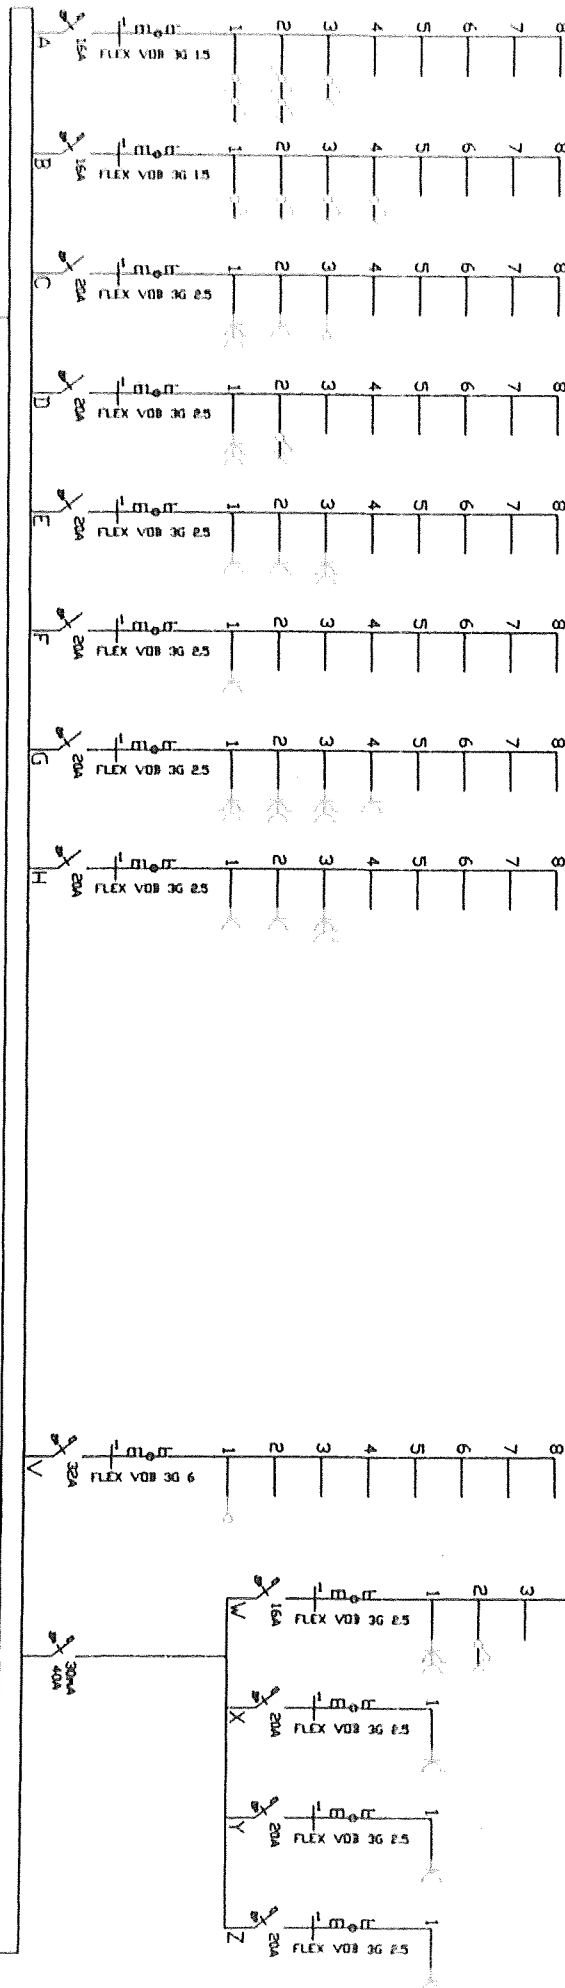

Spanning: 230V

2P
40A 300mA

XVB4x10 vanuit meterkast

Project : Albee, Theo Van Den Boschstraat 69 bus 002, 2100 Deurne

CONTROLE

Datum
18/12/2018

Nr.
1/1

Plan nr.
PLANNUMMER

Getekend
Dekkers Kurt

A0.8

Dekkers Elektriciteitswerken

Beulken 6
2321 Meer

kurt@dekkeers.be
Tel 0479/91.46.27
Bt.W. 0832.234.363

BTW
20-12-18

Licht leefruimte,
Terras

Licht berging, toilet,
Wasplaats, slaapkamer

CV, ventilatie
Sk telenet


Sk werkblad

Sk werkblad
Ijskast, dampkap

Sk oven

Sk leefruimte,
Terras

Sk slaapkamer

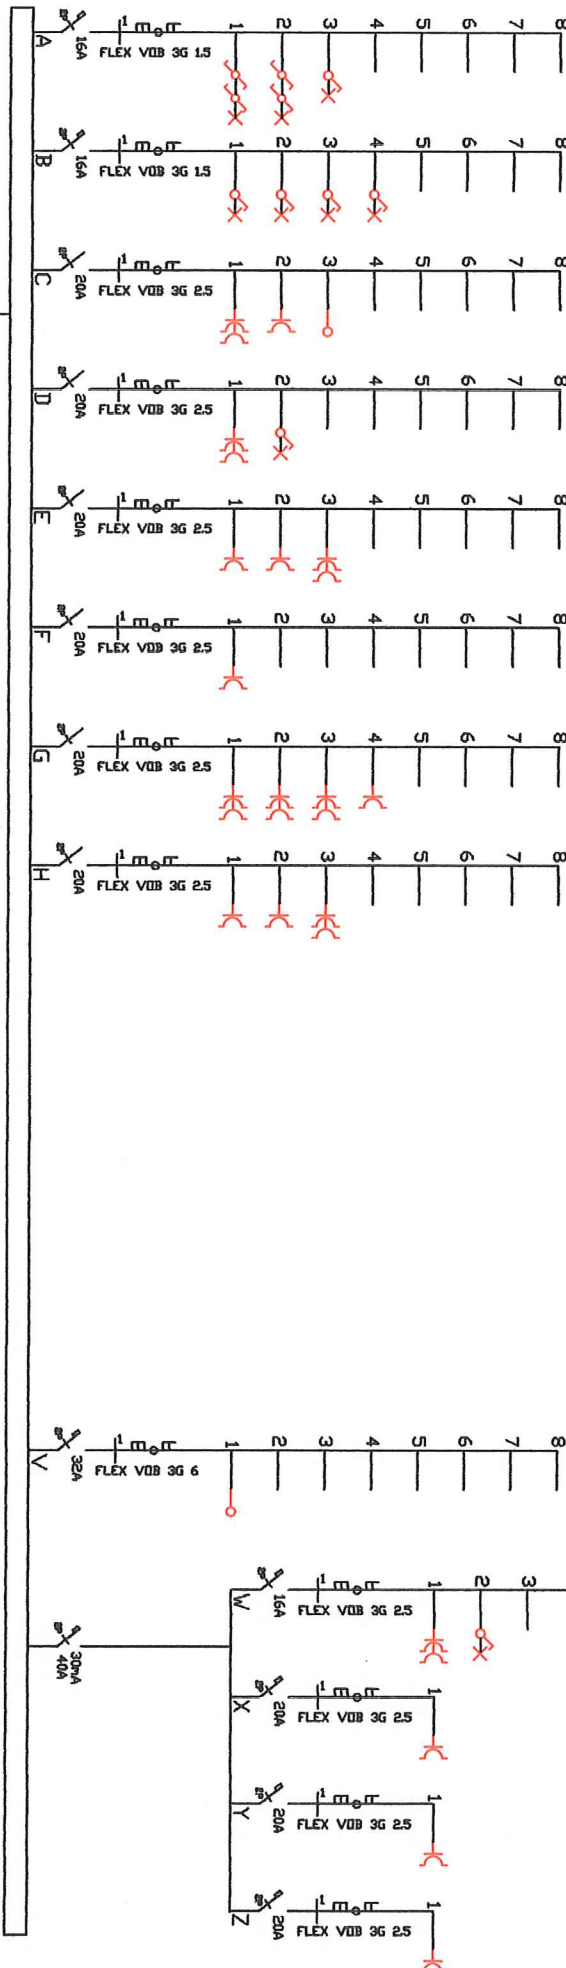

Fornuils

Badkamer

Wasmachine

Droogkast

Vaatwasser

Spanning: 230V

Projekt : Albe, Theo Van Den Boschstraat 69 bus 002, 2100 Deurne

Rev.	Datum	Wijzigingen
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING
REV.	DATUM	WIJZIGING

CONTROLE

Datum
18/12/2018
Nr.
1/1

Plan nr.
PLANNUMMER

Getekend
Dekkers Kurt

A0.8

Dekkers Elektriciteitswerken

Baulken 6
2321 Meer

kurt@dekke.be
Tel 0479/91.46.27
B.T.W. 0832.234.565

