

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 80983
Cont.pers.: Jonas De Ceuster
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0494/079.884
e-mail: jdc.aew@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS08
Verslagnr.: 4533229
Voorl. verslagnr.:
Datum: 08/04/2015

Klant / Opdrachtgever:
JDC A.E.W.
WEISPOEL 18/1
9150 BAZEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: APPARTEMENT 1ste LINKS STANDPLAATS 38 DUFFEL 2570
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 08/04/2015 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2040 Onderzoeker: HENDRICKX HANS
Eigendom van: Van Leemputten - Stevens
Installateur: JDC A.E.W. Weispoel 18 bus 1 9150 Bazel
B.T.W.: BE 0544.912742 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 284865 Stand I : 371 kWh Stand II -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Diff. 2p 40A/300mA Schak.: aut. maatsch.: 2p. 40 A
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 2x 16 mm² spreidingswaarde: 13,05 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/ 300 + 30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 363 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 11

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


- N | Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N | Vaste verlichtingsarmaturen nog te plaatsen + badkamer nog af te werken (douche + ventilator + tegelen) + keuken nog af te werken.
GEEN INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Onderzoeker: HENDRICKX Hans
 Datum: 08.04.2015
 PV nr.: 4533229
 Handtekening: 

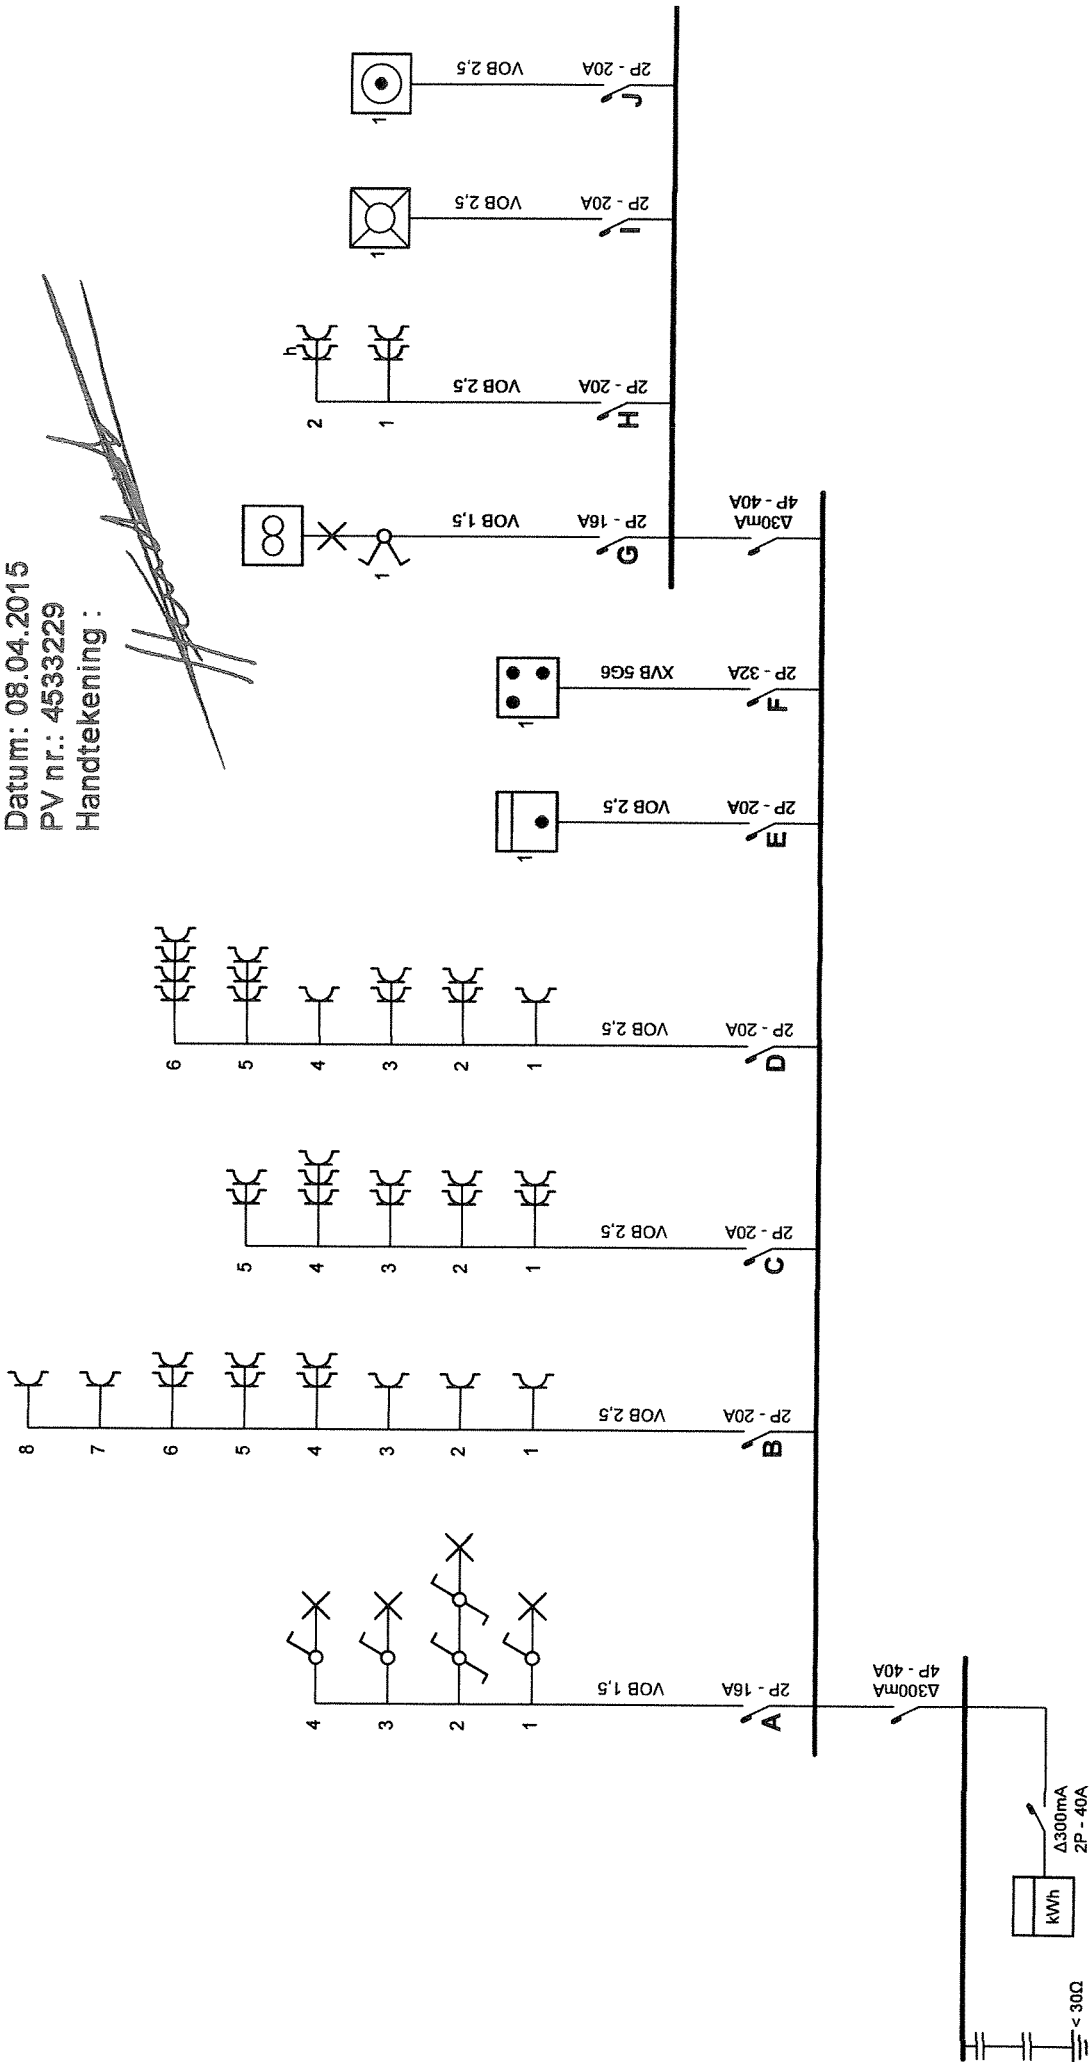


Erkend Organisme
 O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ete@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
 Van Leerputten - Stevens / Maabo - Interieur
 Standplaats 38
 2570 Duffel
 GSM: 0472903197
 e-mail: info@maabo-interieur.be
 0843.377.188

Installateur
 JDC A.E.W.
 Weispoel 18 bus 1
 9150 Bazel
 GSM: 0494 07 98 84
 e-mail: jdc.aew@telenet.be
 BTW BE 0544.912.742


P-1/4
Eendraadschema
 Datum: 8/04/2015
 2 x 230V ~ 50Hz



Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Onderzoeker : HENDRICKX Hans
 Datum: 08.04.2015
 PV nr.: 4533229
 Handtekening :

<p> Erkend Organisme O.C.B. Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tel.: 03 451 37 00 Fax: 03 451 37 10 e-mail: dep.ete@ocb.be </p>	<p> Plaats van de elektrische installatie Van Leemputten - Stevens / Mabo - Interieur Standplaats 38 2570 Duffel GSM: 0472903197 e-mail: info@mabo-interieur.be 0843.377.188 </p>	<p> Installateur JDC A.E.W. Weispoel 18 bus 1 9150 Bazel GSM: 0494 07 98 84 e-mail: jdc.aew@telenet.be BTW BE 0544.912.742 </p>	<p> p. 2/4 Eendraadschema Datum: 8/04/2015 2 x 230V ~ 50Hz </p>
---	--	--	---

Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Onderzoeker : HENDRICKX Hans
 Datum: 08.04.2015
 PV nr.: 4533229
 Handtekening :

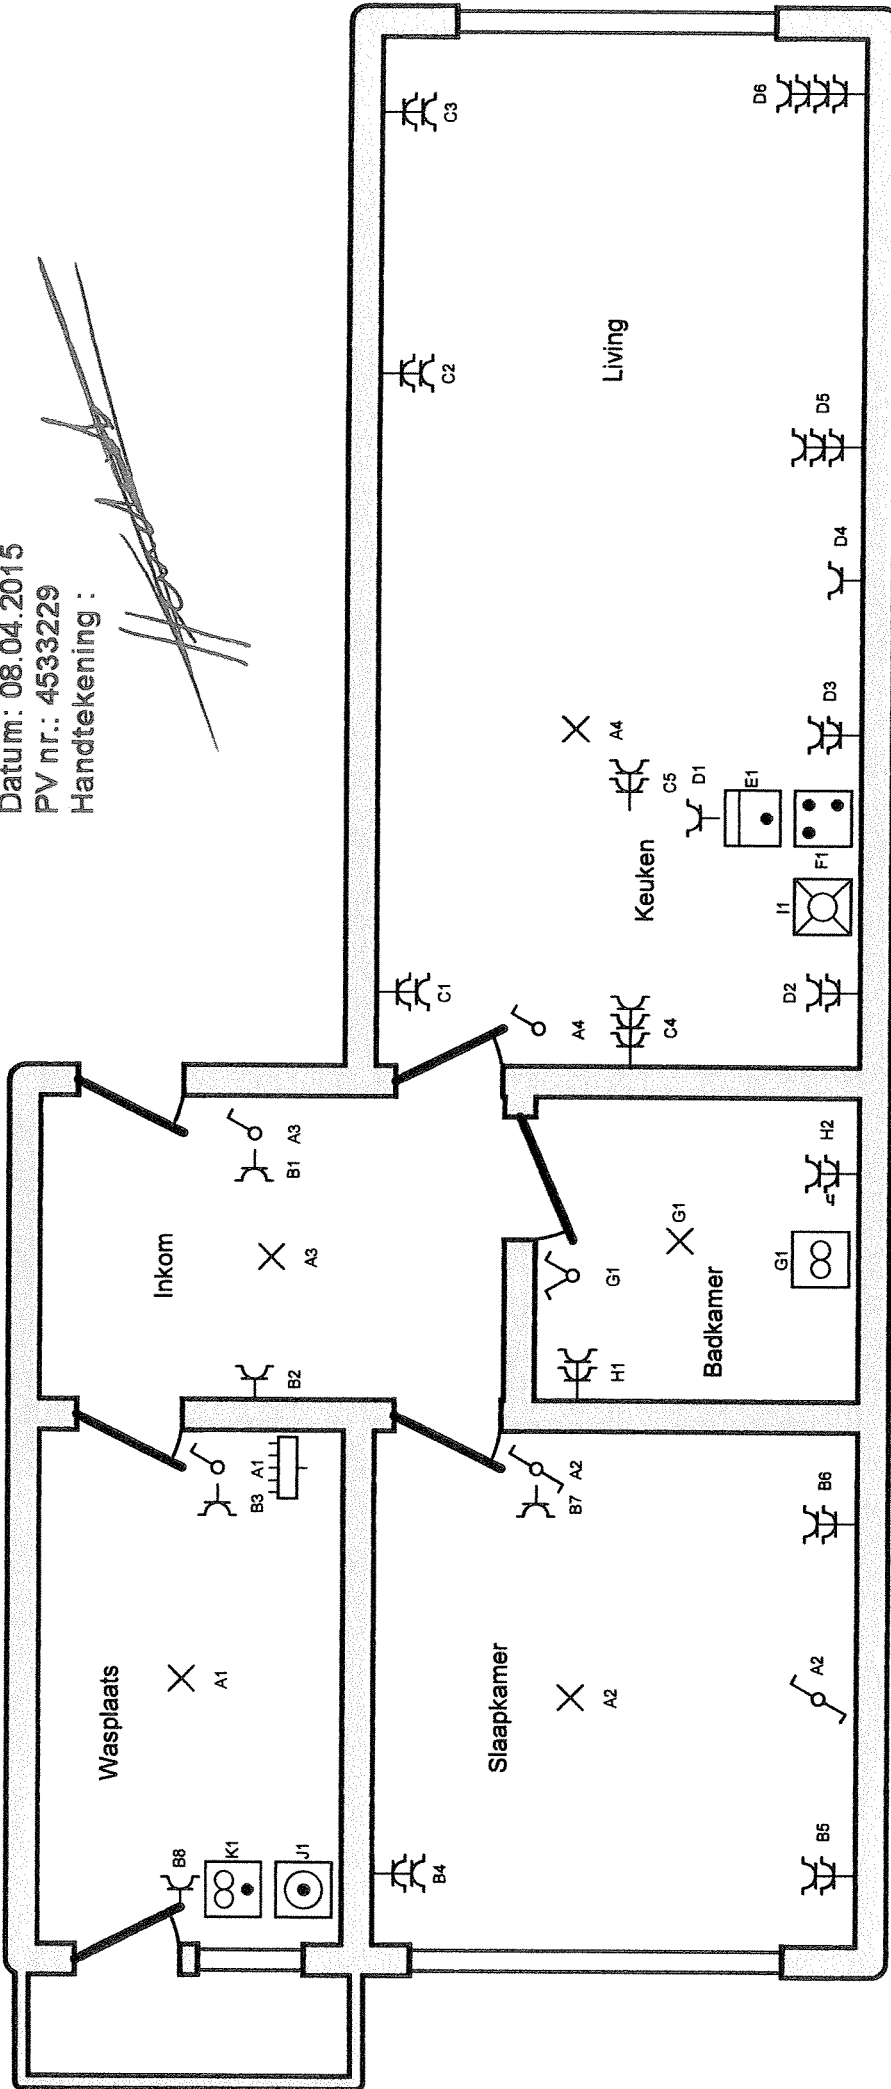

Erkend Organisme
 O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
 Van Leemputten - Stevens / Mabo - Interieur
 Standplaats 38
 2570 Duffel
 GSM: 0472903197
 e-mail: info@mabo-interieur.be
 0843.377.188

Installateur
 JDC A.E.W.
 Weispoel 18 bus 1
 9150 Bazel
 GSM: 0494 07 98 84
 e-mail: jdc.aew@telenet.be
 BTW BE 0544.912.742

P. 3/4
Situatieschema
 Datum: 8/04/2015
 2 x 230V ~ 50Hz

A: Verlichting wasplaats, inkom, slaapkamer en keuken.

B: Stopcontacten inkom, wasplaats en slaapkamer.

C: Stopcontacten keuken en living.

D: Stopcontacten keuken en living.

E: Oven.

F: Kookvuur.

G: Verlichting badkamer en ventilator.

H: Stopcontacten badkamer en boiler.

I: Vaatwas.

J: Wasmachine.

K: Droogkast.

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : HENDRICKX Hans
Datum: 08.04.2015
PV nr.: 4533229
Handtekening :



Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Van Leemputten - Stevens / Mabo - Interieur
Standplaats 38
2570 Duffel
GSM: 0472903197
e-mail: info@mabo-interieur.be
0843.377.188

Installateur

JDC A.E.W.
Weispoel 18 bus 1
9150 Bazel
GSM: 0494.07 98 84
e-mail: jdc.aew@telenet.be
BTW BE 0544.912.742

p. 4/4
Lijst Kringen

Datum: 8/04/2015

2 x 230V ~ 50Hz

