


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Paleisstraat 79, 3de vd te 2018 Antwerpen
 Naam eigenaar Van Noyen
 Adres eigenaar
 Type object studio
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek periodiek

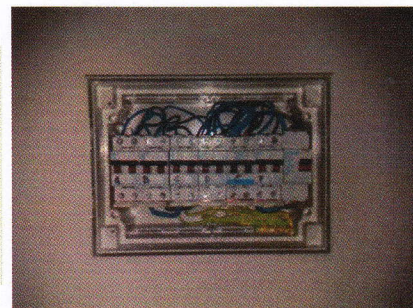

Het onderzoek is verricht op 20/10/2010 volgens artikel art 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 2 x 230 (2f)
 Type elektrode pen
 Ø voedingsleiding (mm²) 10
 Waarde hoofdschakelaar (A) 40

Gegevens hoofdbeveiliging (A) 40
 Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) 30
 Aantal verdeelborden 1
 Aantal stroombanen per verdeelbord 5

Metingen

RA / ZS (Ω) 50 /
 Continuïteitsmeting goed

ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) goed
 Isolati weerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. Losse leidingen op de beveiliging van stroombaan E. 3 leidingen onder 1 klem.
2. De installatie in de badkamer is niet aanvullend beveiligd door middel van een ADS met een gevoeligheid van maximaal 30 mA (86.08).
3. De wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen moeten aanvullend worden beveiligd door een ADS van 30 mA (art.86.08 AREI).
4. De waarde van de spreidingsweerstand is hoger dan de maximale toegestane waarde van 30 ohm (art. 86.07).
5. De doorsnede van de aardgeleider is onvoldoende (art. 71).
6. De aardgeleider is los.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Besluit

De installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het AREI.


In geval van verkoop van een wooneenheid, met een (ver)bouwjaar van de installatie van vóór oktober 1981, moet een aanvullend controlebezoek worden uitgevoerd uiterlijk 18 maanden na de datum van akte van overdracht. In alle andere gevallen moet het aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd door hetzelfde controleorganisme.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de directeur, op 20/10/2010

Naam agentonderzoeker: Omar Rahmouni

Handtekening:



Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
