ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 08/07/2020 **Inspecteur:** Yves Pelgrims **Mentor:** **Installateur:** Teodor Nistor

ID-label: Particulier: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3.

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 837 511 559

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serie Nr:: 19370740

Plaats van het onderzoek	
Straatnaam	Bogaardstraat
Huisnummer	82
Busnummer	
Postcode	2600
Gemeente	BerchemBerchem
Land	België

Eigenaar	
Naam	-
Straatnaam	Bogaardstraat
Huisnummer	82
Busnummer	
Postcode	2600
Gemeente	BerchemBerchem
Land	België

Naam contactpersoon	Teodor Nistor
Telefoon	0466 48 12 55
Gsm nr. (SMS)	

Installateur	
Naam	Teodor Nistor
BTW nr.	BE 837 511 559
Telefoonnummer	0466 48 12 55
E-mail	teodornistor78@gmail.com

Type : woning **EAN** : 541448820046733654 **Teller Nr.:** : 1SAG1100119775



Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 17 Isolatie: 556 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 4,75 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	17	Ok	Ok
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32		2	6
10	C	20		2	2,5
6	C	16		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) ◉ OK ○ NOK **Directe aanraking** ◉ OK ○ NOK **Indirecte aanraking** ◉ OK ○ NOK

Aansluitingen ◉ OK ○ NOK **Correcte schema's** ◉ OK ○ NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☐

Equipotentiale verbindingen ◉ OK ○ NOK ○ niet van toepassing ○ in afwachting

Continuiteit ◉ OK ○ NOK **Verlichting / toestellen** ○ OK ○ NOK ◉ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O36 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 8/7/2045

☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:

☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Yves Pelgrims



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/7/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

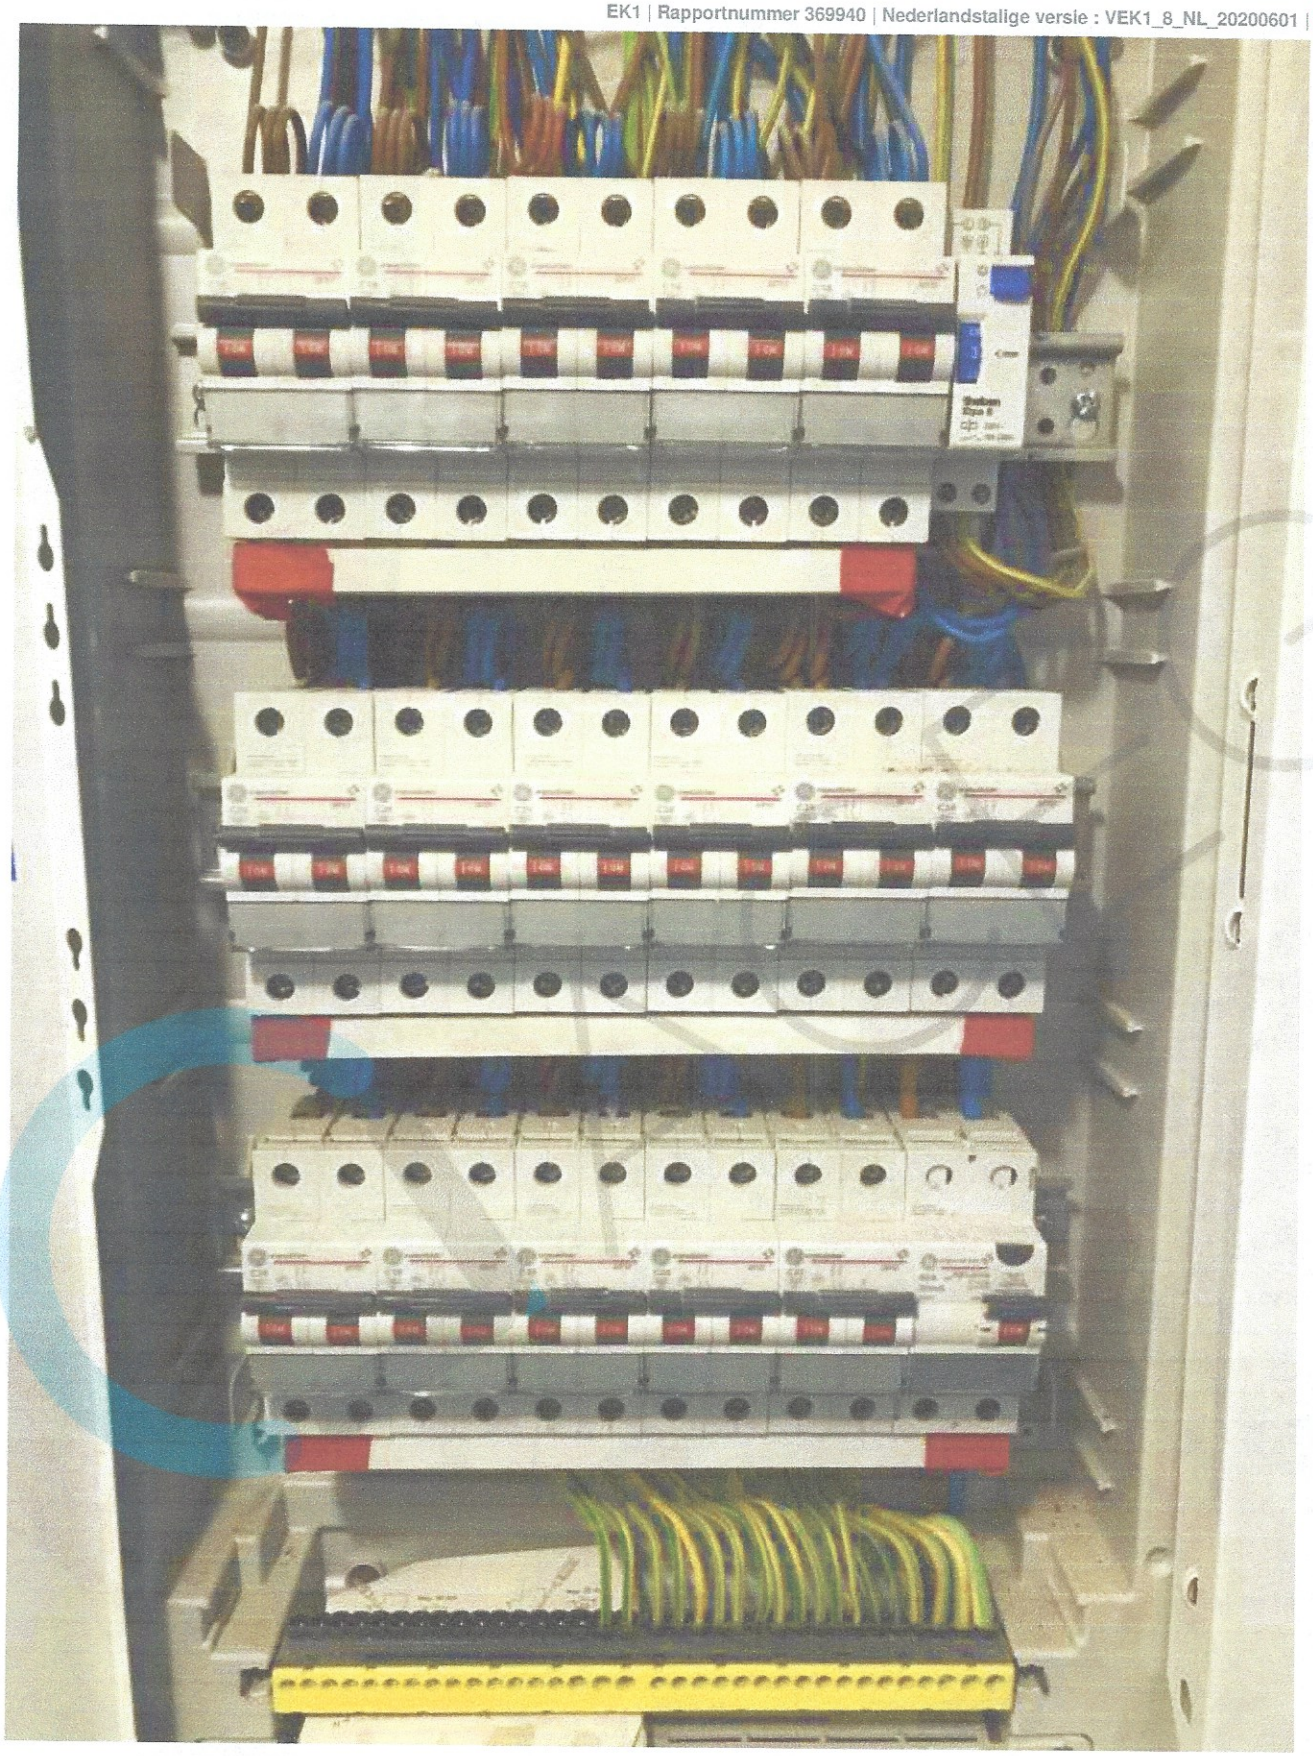

Eurotest 61557
METREL
F1
F2
F3
F4
RLOOP N-PE
PE
R, PEARTH
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
LOCATOR
POWER, ENERGY
HARMONICS

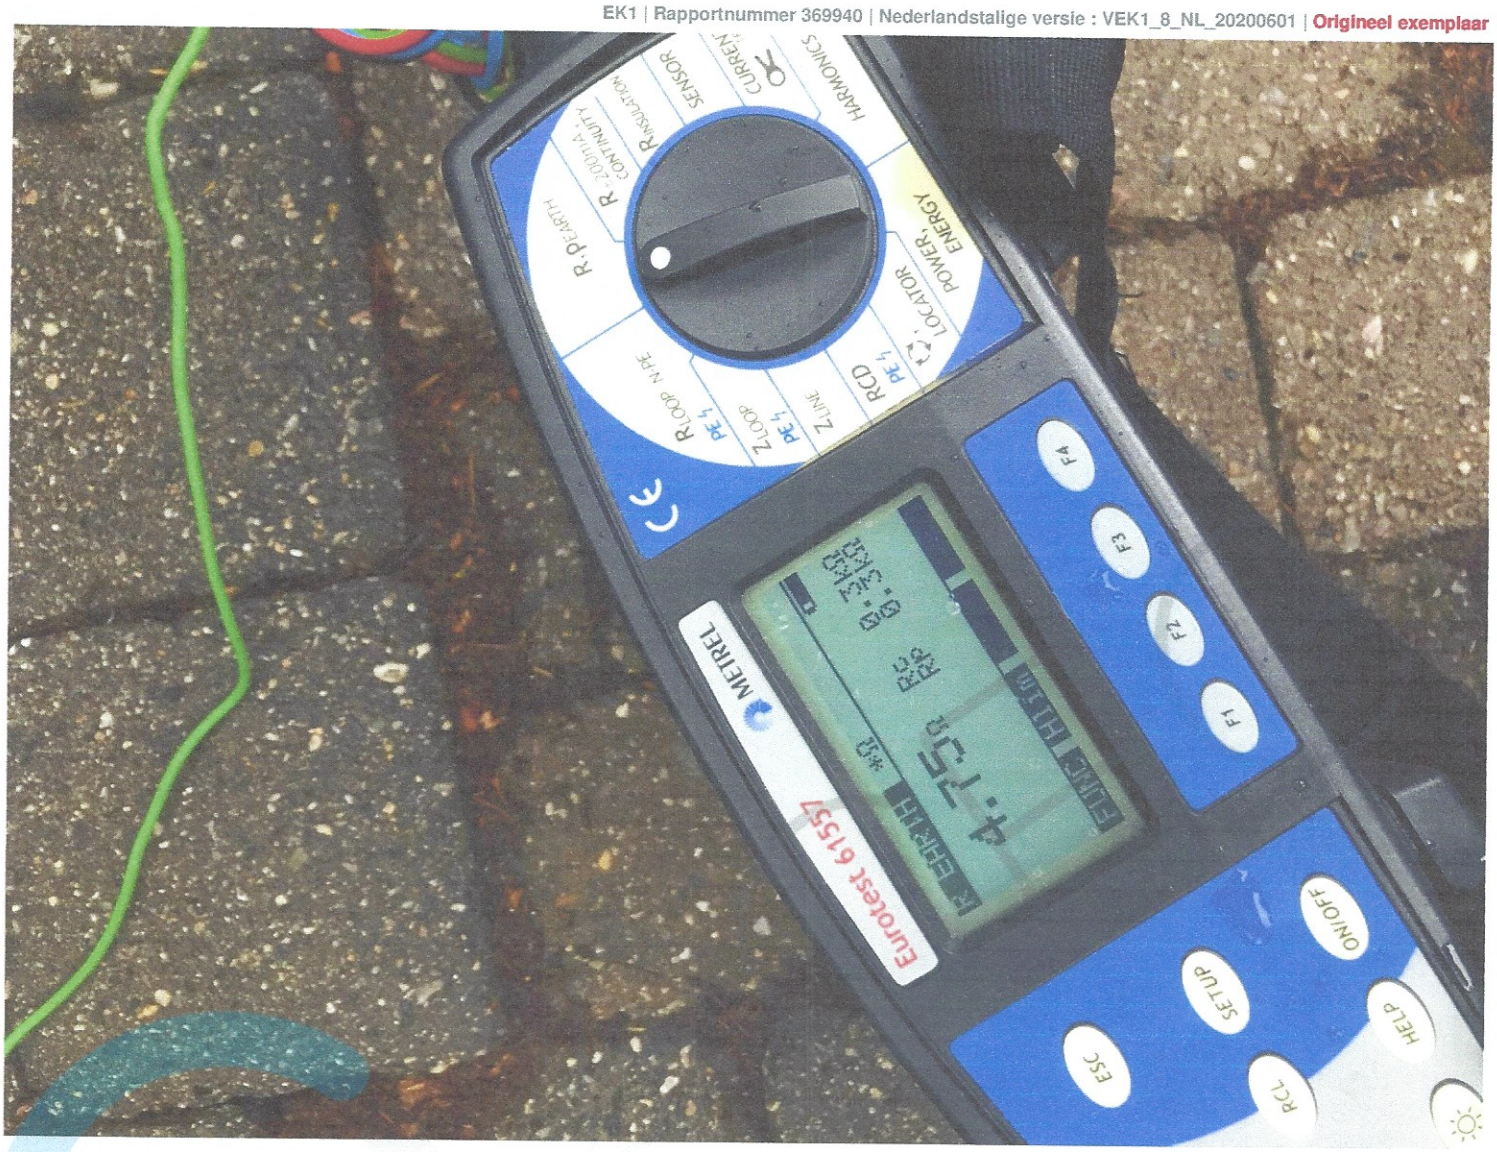
R.PEARTH
R 200mA CONTINUITY
R INSULATION
SENSOR
CURRENT
HARMONICS
POWER, ENERGY
LOCATOR
RCD
Z LINE
Z LOOP
R LOOP N-PE
METREL
Eurotest 61557
F4
F3
F2
F1
ON/OFF
SETUP
HELP
RCL
ESC

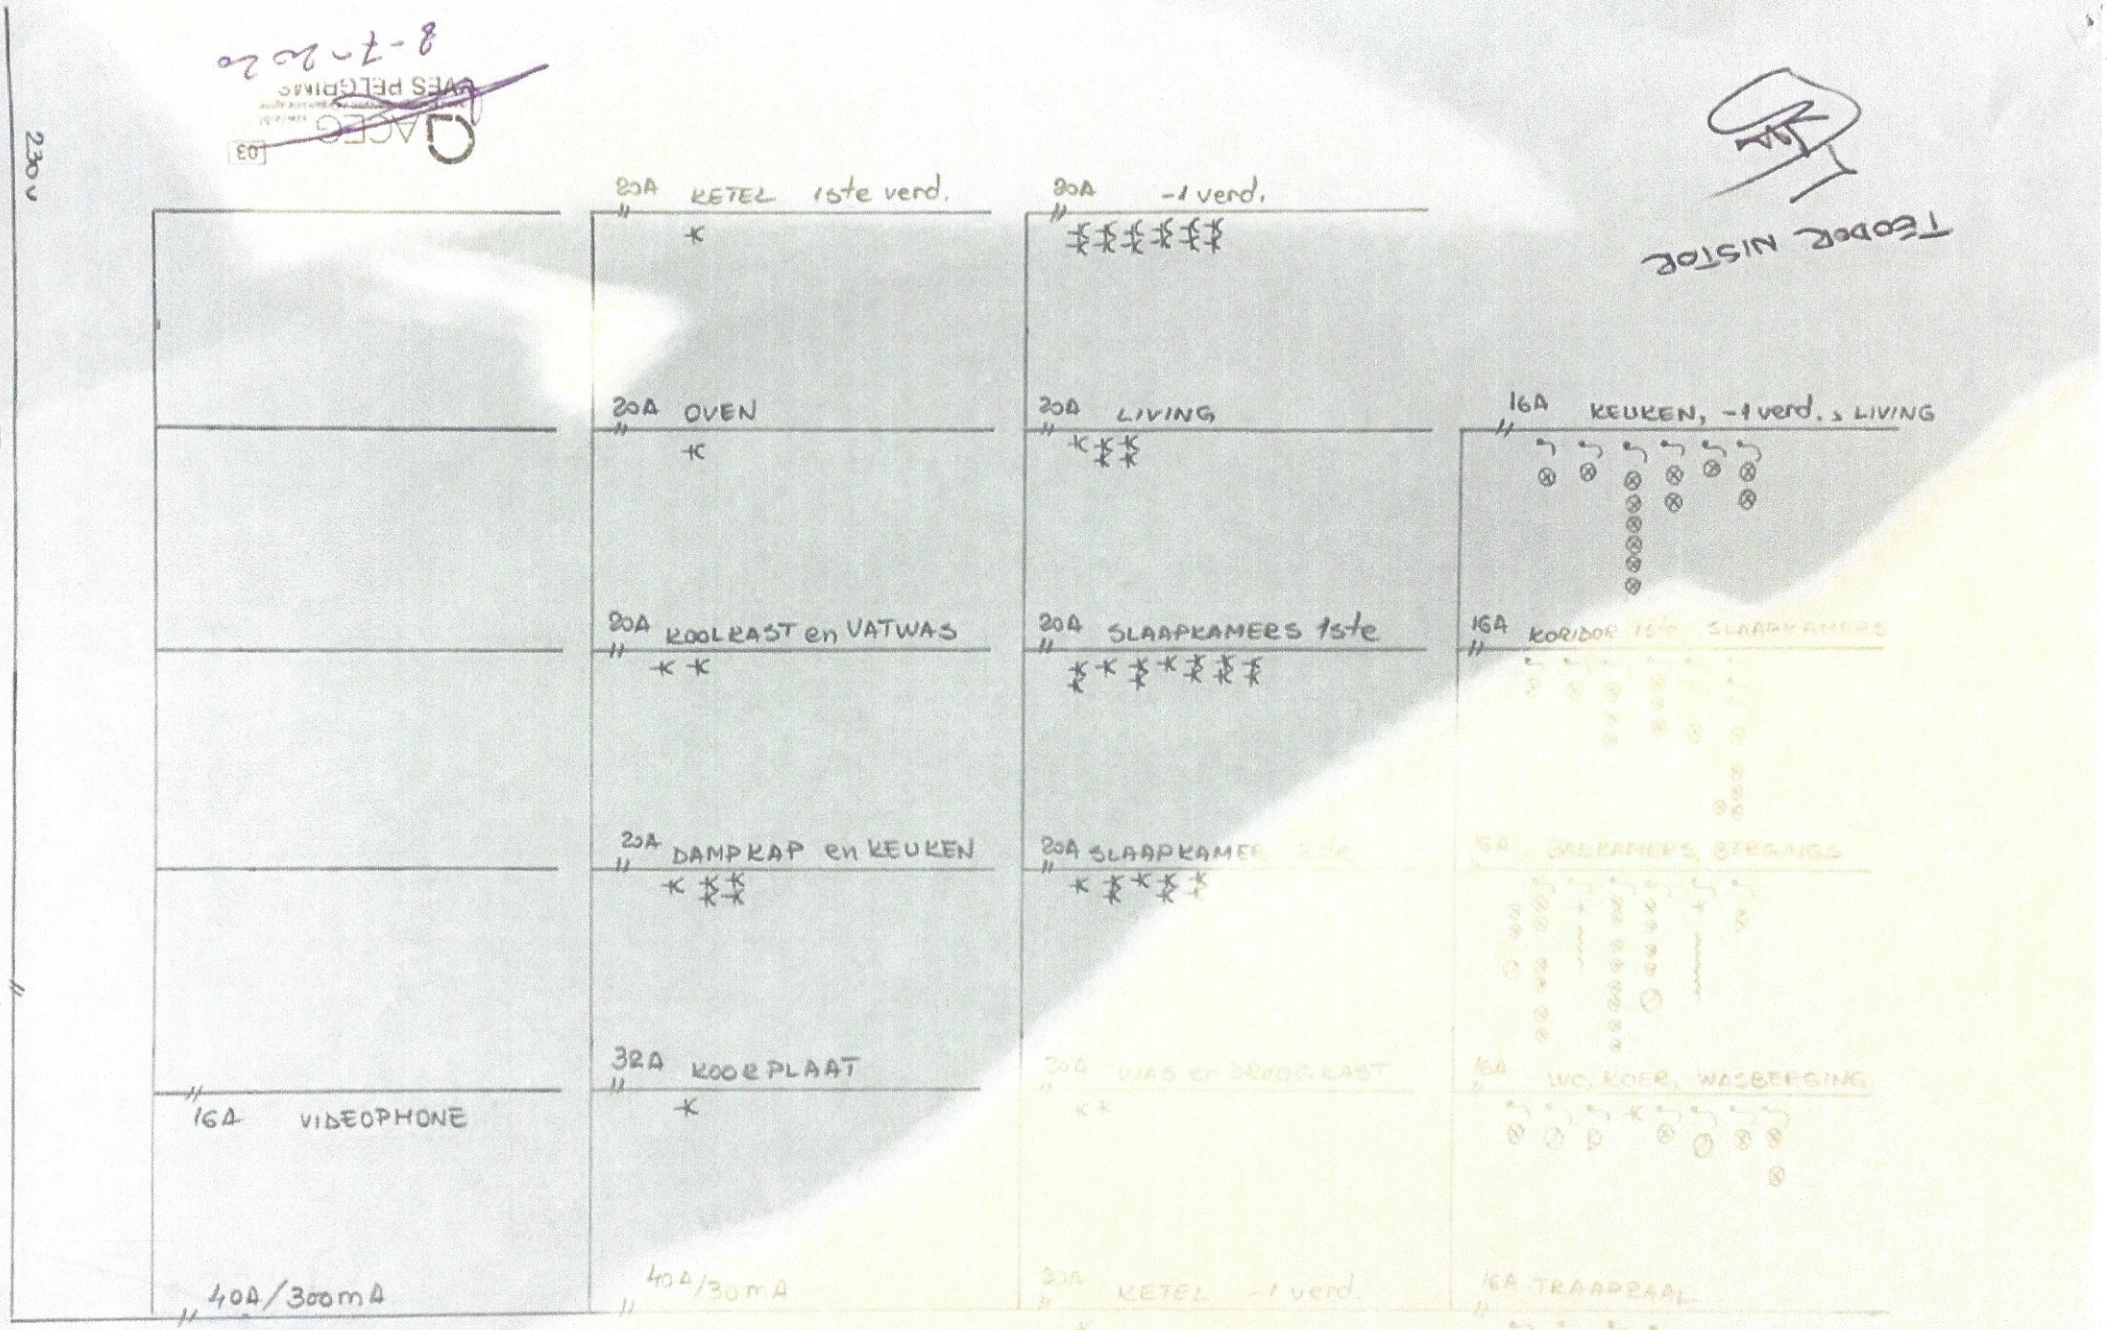
8-7-26
230 v
40A/300mA
20A KETEL 1ste verd.
20A -1 verd.
20A OVEN
20A LIVING
16A KEUKEN, -1 verd. & LIVING
20A KOELKAST en VATWAS
20A SLAAPKAMERS 1ste
16A KORIDOR 1ste SLAAPKAMERS
20A DAMPKAP en KEUKEN
20A SLAAPKAMER 2de
16A BADKAMERS, BERGINGS
32A KOOKPLAAT
20A WAS en DROOGKAST
16A WC, KOER, WASBEKKING
16A VIDEOPHONE
40A/30mA
20A KETEL -1 verd.
16A TRAAPRAAL

TEODOR NISTOR

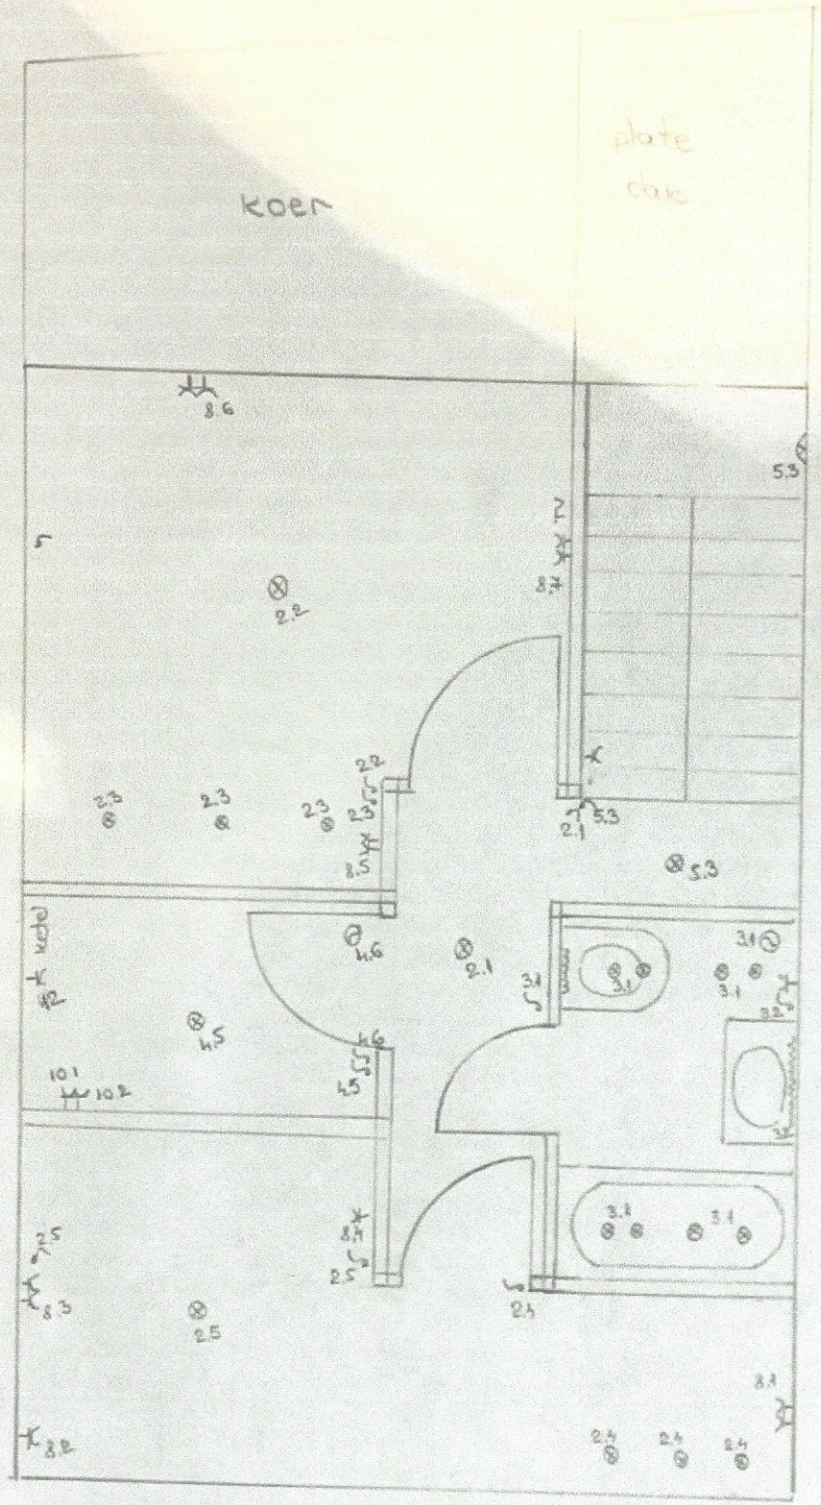

ACFG
YVES PEEK
8.7.202

03

1ste verdieping

Boomgaardstraat 82

TEODOR NISTOR

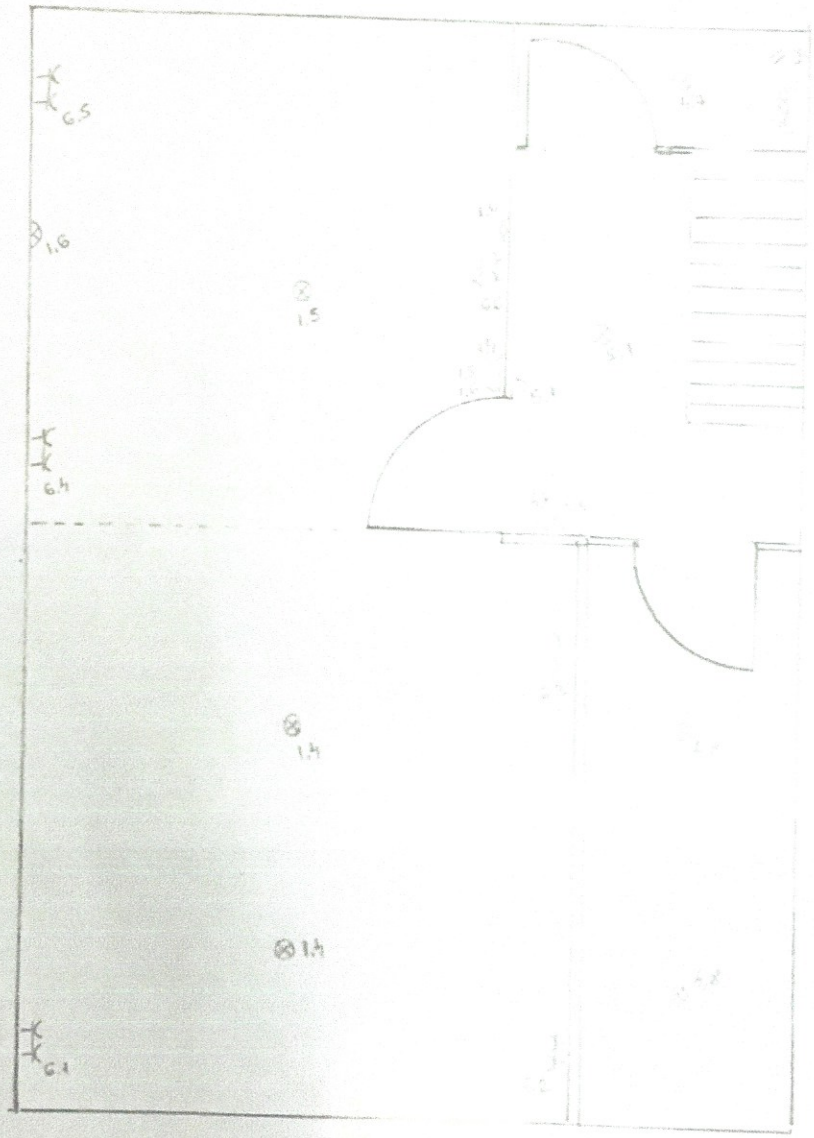

-1 verdieping

Bloemgaardstraat 82

ACEG
YVES PELLEGRIN
8-7-2020
03

TEODOR NISTOR

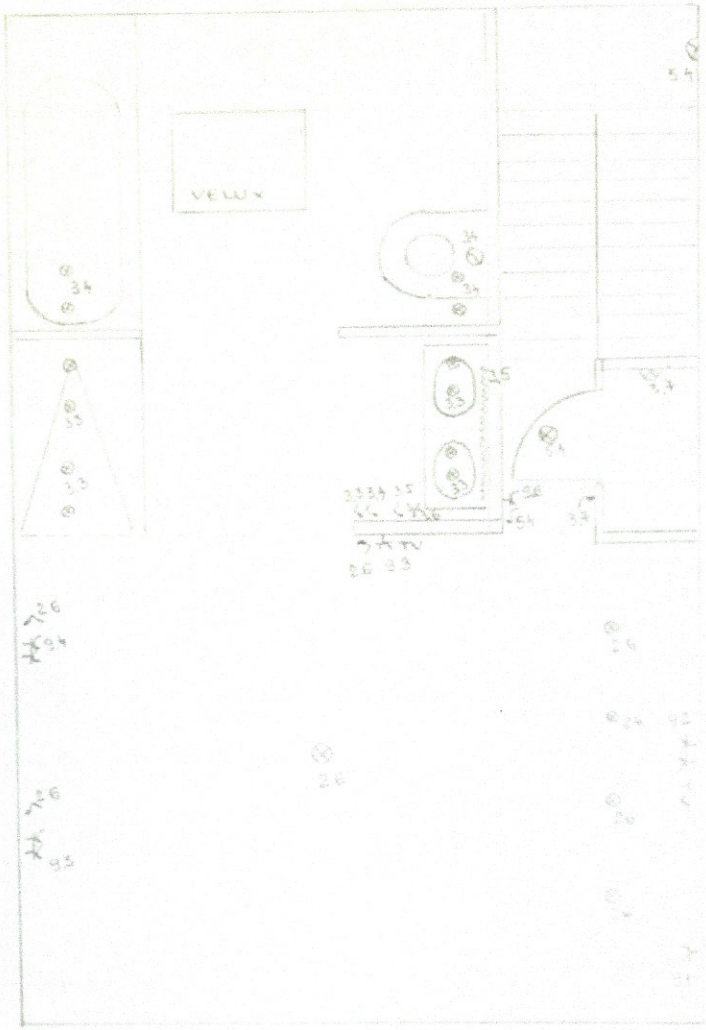

2 de verdieping

Boomgaardstraat 52

ACEG
YVES PEL
8-7-2020

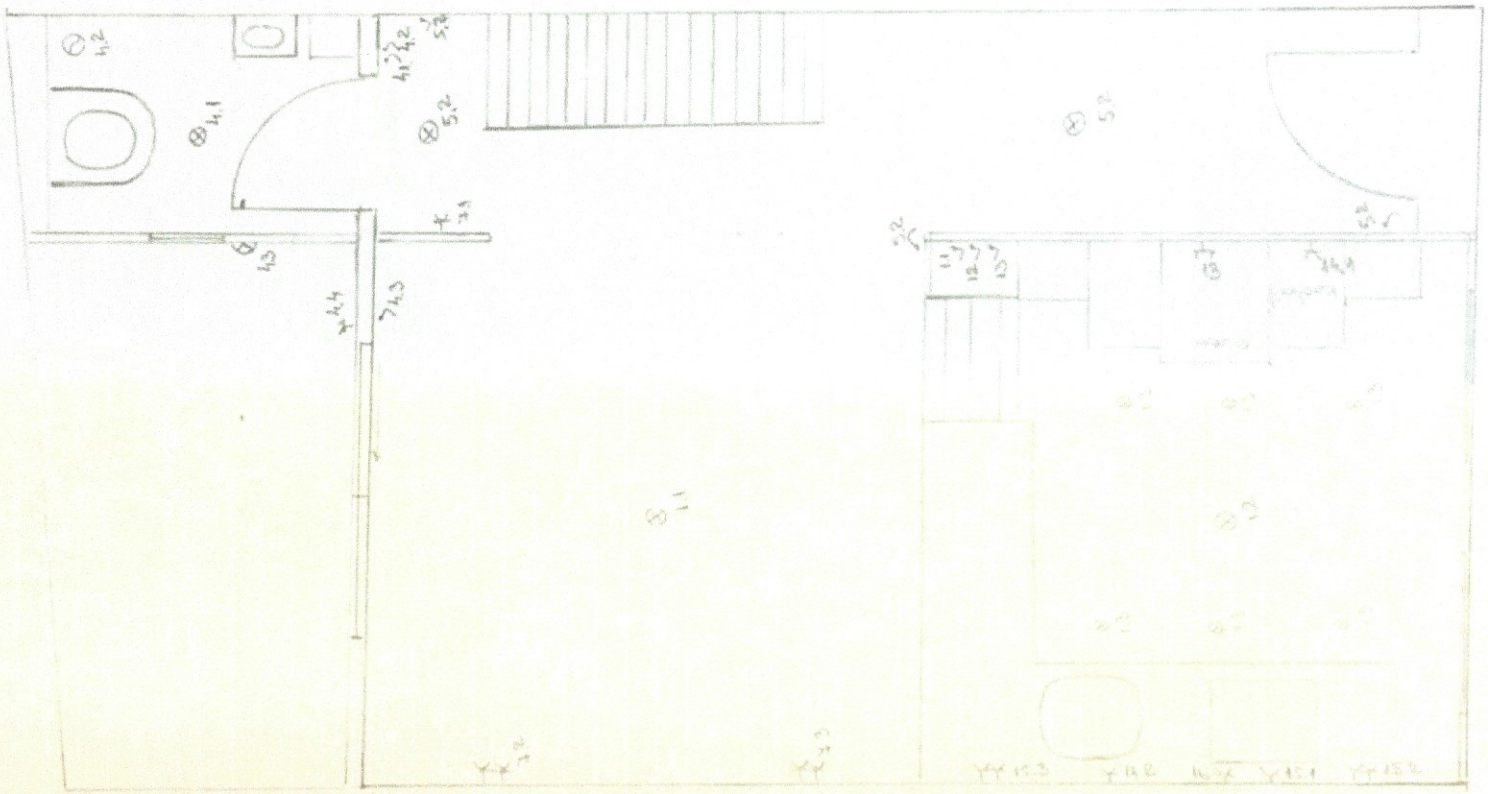

TEODOR NISTOR

ACEG

YVES PELGRIMS

03

8-7-202
